


PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO - ALTIPIANO

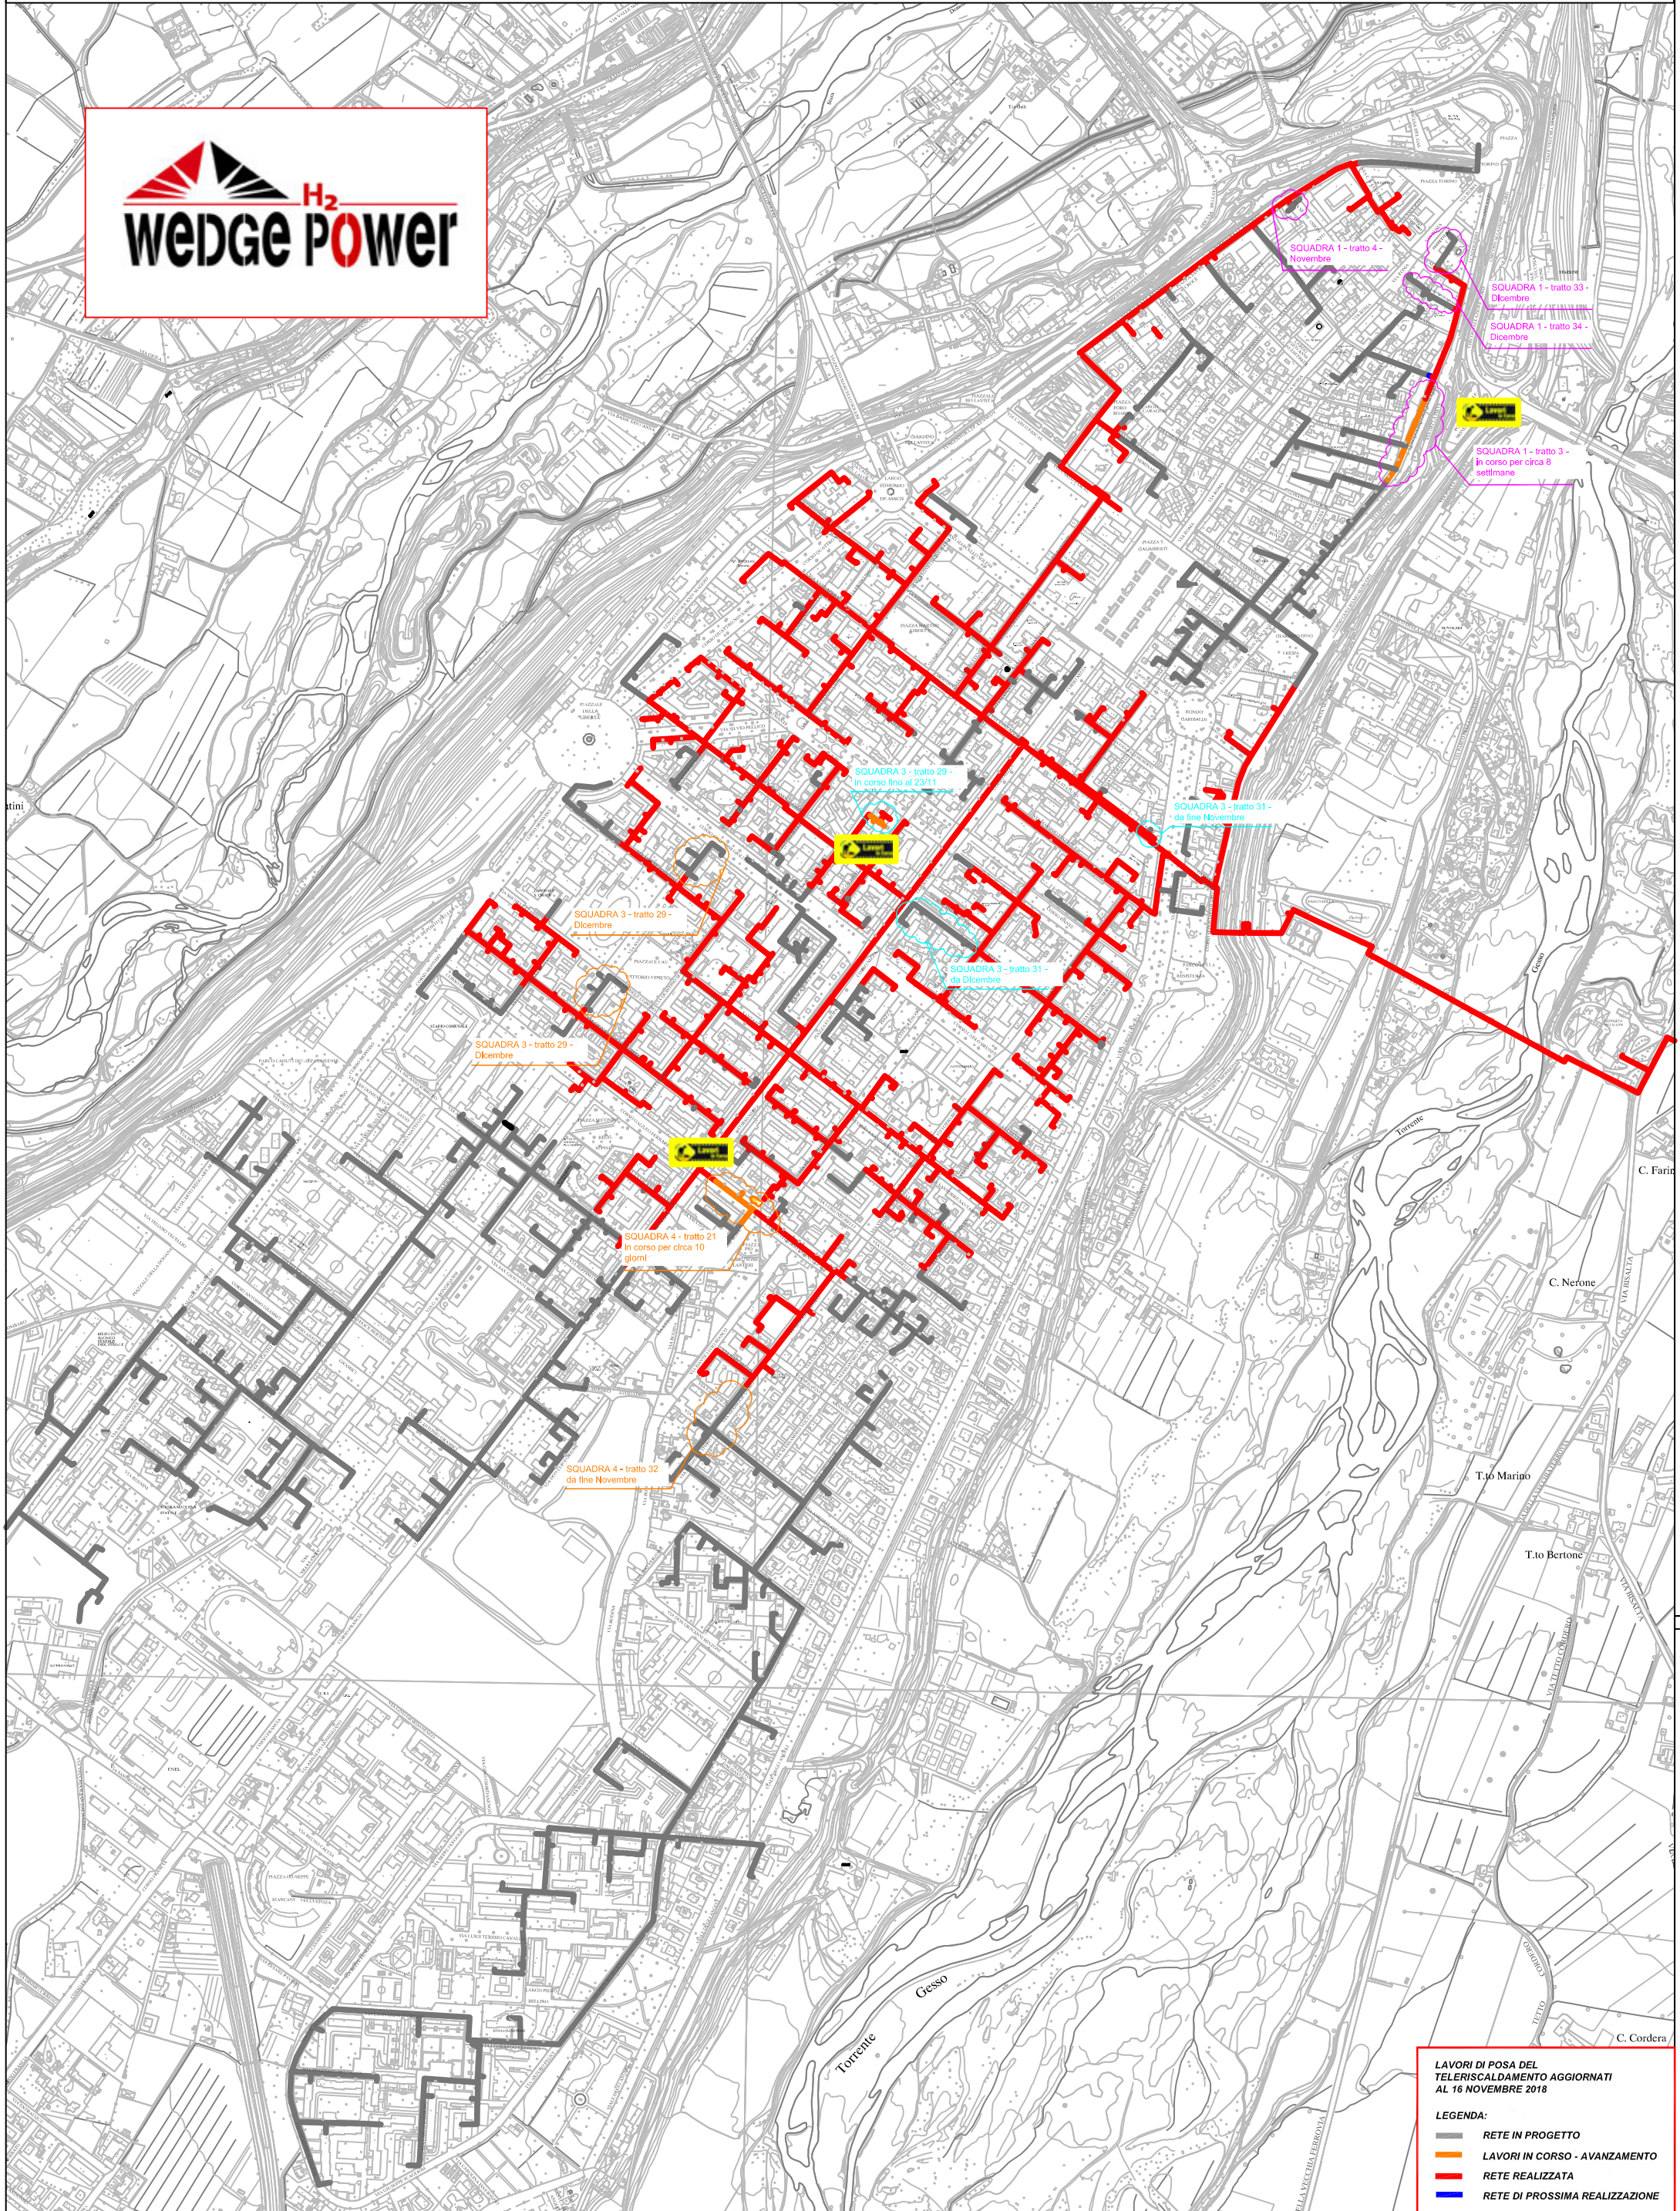

LAVORI DI POSA DEL TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI AL 16 NOVEMBRE 2018

LEGENDA:

- RETE IN PROGETTO
- LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
- RETE REALIZZATA
- RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE

SQUADRA 1 - tratto 4 -
Novembre

SQUADRA 1 - tratto 33 -
Dicembre
SQUADRA 1 - tratto 34 -
Dicembre

SQUADRA 1 - tratto 3 -
in corso per circa 8
settimana

SQUADRA 3 - tratto 29 -
in corso fino al 23/11

SQUADRA 3 - tratto 31 -
da fine Novembre

SQUADRA 3 - tratto 29 -
Dicembre

SQUADRA 3 - tratto 31 -
da Dicembre

SQUADRA 3 - tratto 29 -
Dicembre

SQUADRA 4 - tratto 21 -
in corso per circa 10
giorni

SQUADRA 4 - tratto 32 -
da fine Novembre
