


# PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO

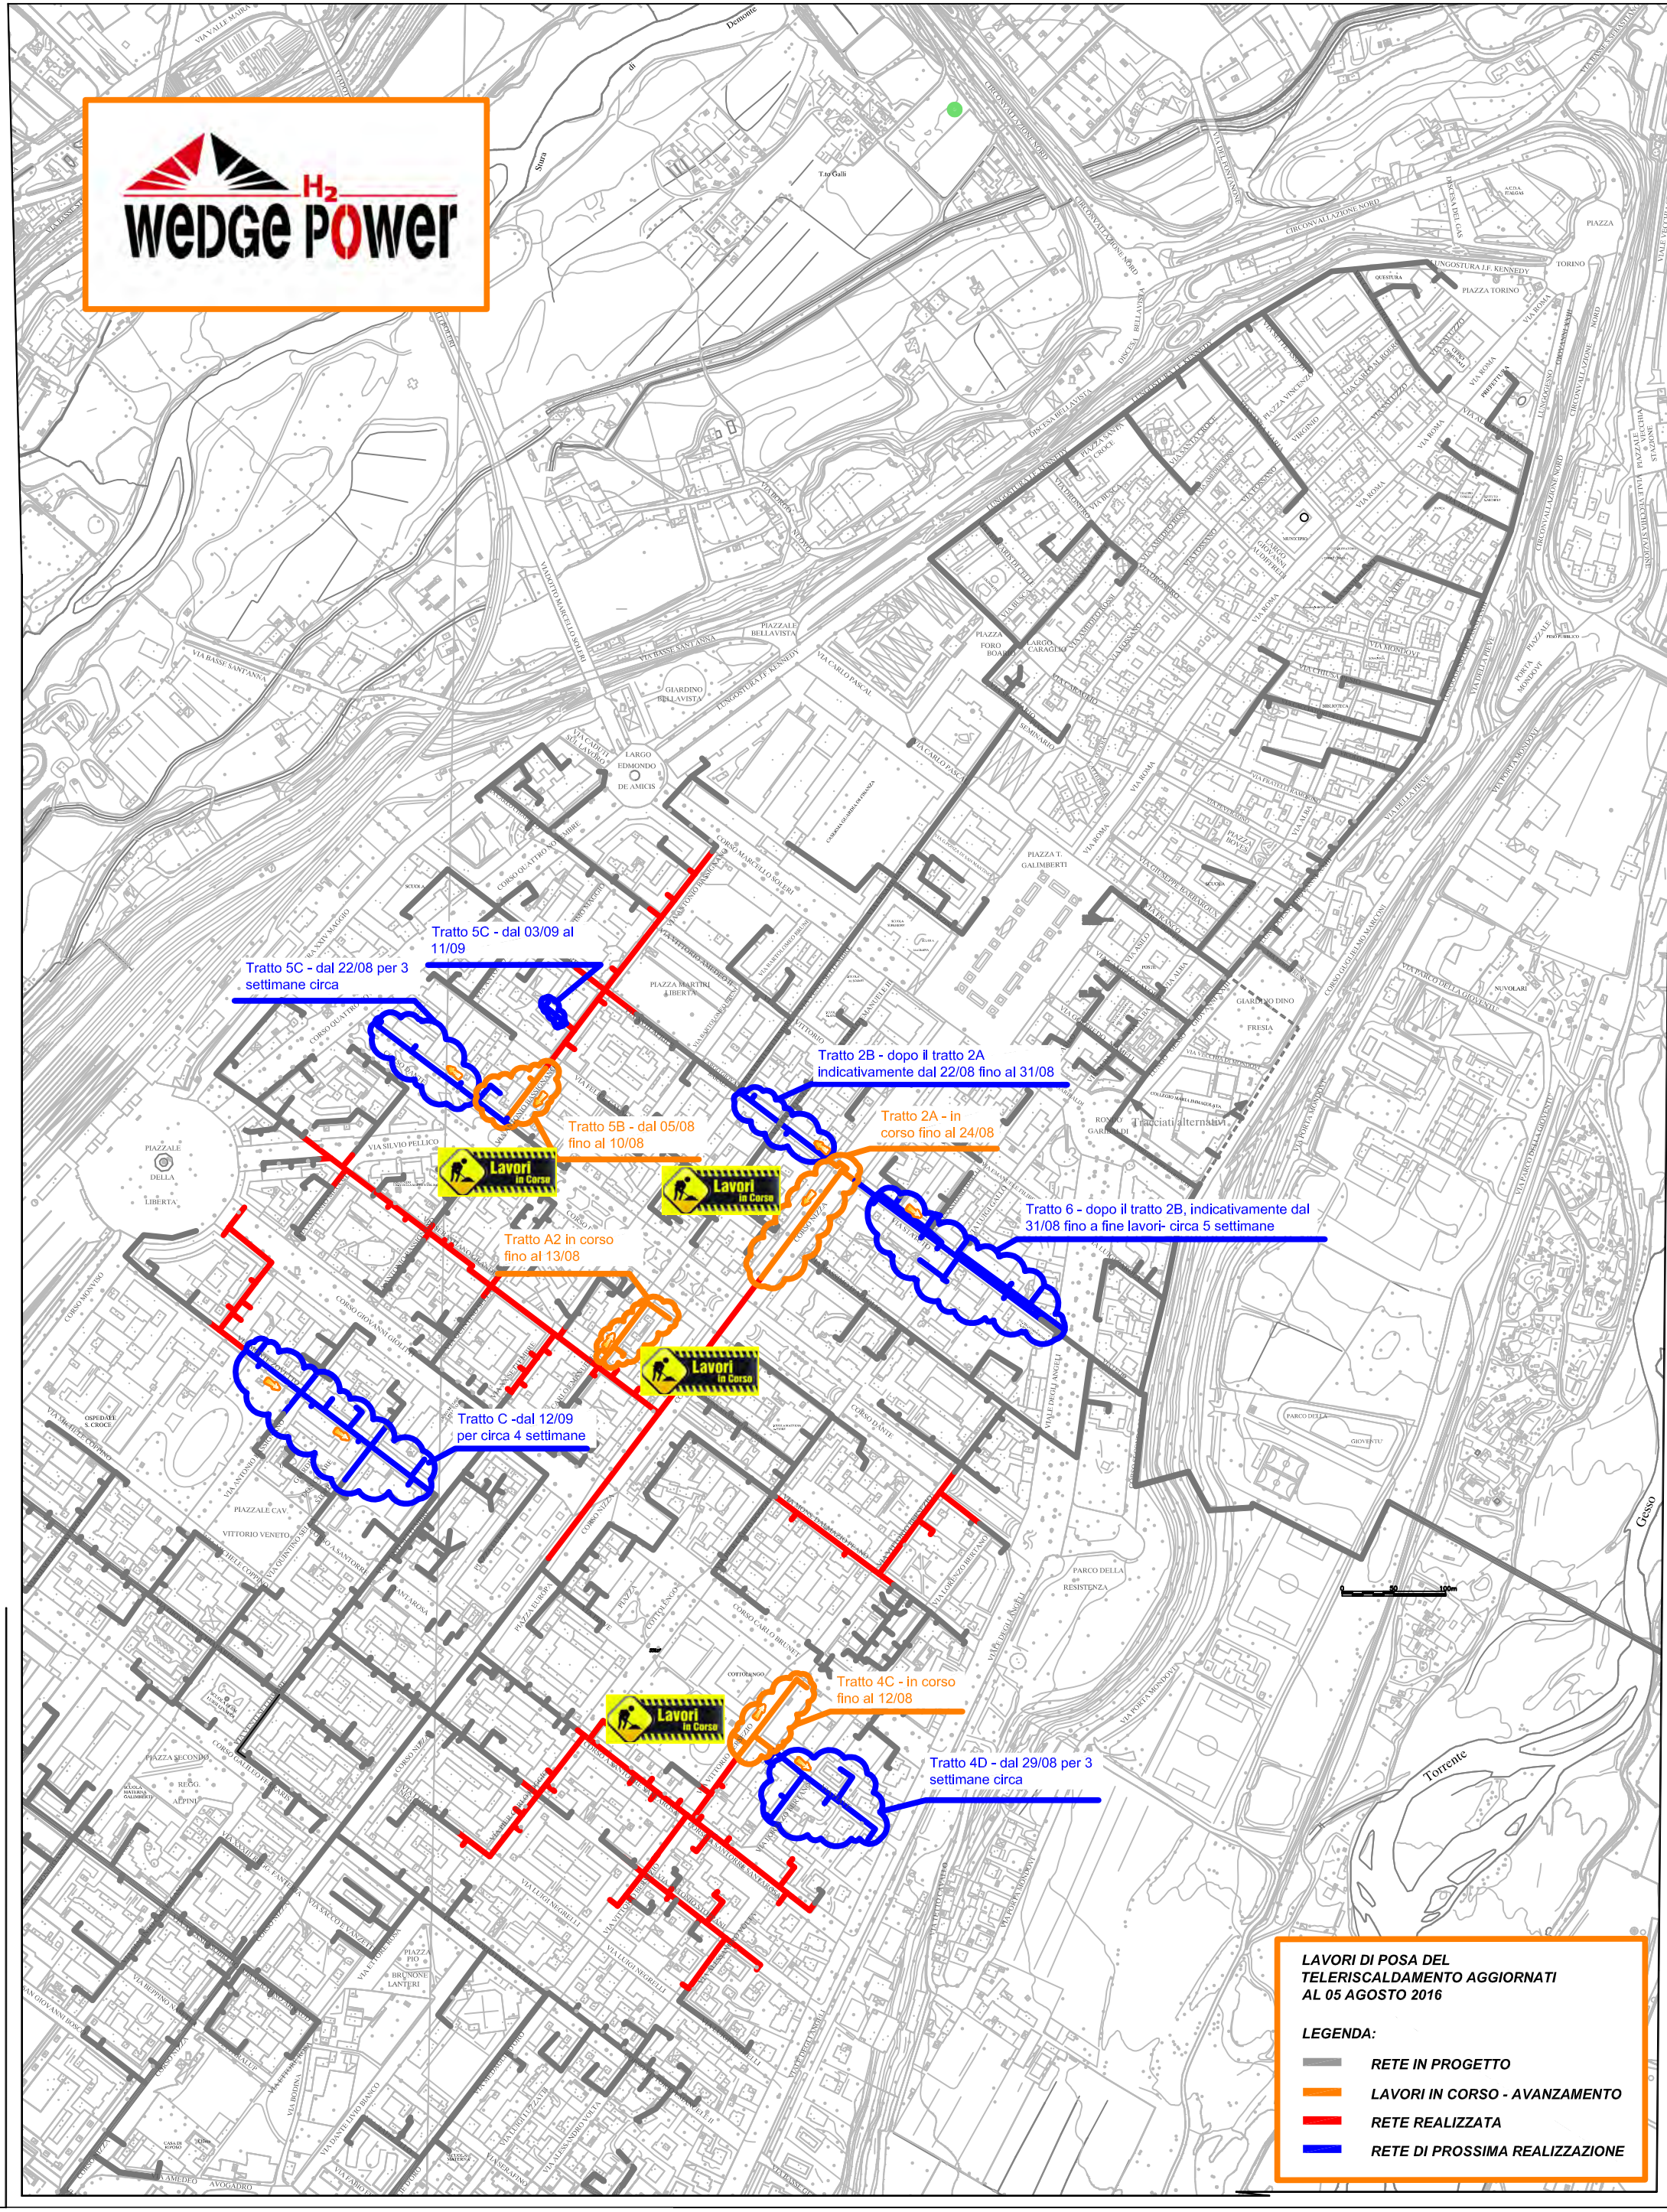

Tratto 5C - dal 22/08 per 3 settimane circa

Tratto 5C - dal 03/09 al 11/09

Tratto 2B - dopo il tratto 2A indicativamente dal 22/08 fino al 31/08

Tratto 5B - dal 05/08 fino al 10/08

Tratto 2A - in corso fino al 24/08

Tratto A2 in corso fino al 13/08

Tratto 6 - dopo il tratto 2B, indicativamente dal 31/08 fino a fine lavori- circa 5 settimane

Tratto C - dal 12/09 per circa 4 settimane

Tratto 4C - in corso fino al 12/08

Tratto 4D - dal 29/08 per 3 settimane circa

**LAVORI DI POSA DEL TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI AL 05 AGOSTO 2016**

**LEGENDA:**

- RETE IN PROGETTO
- LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
- RETE REALIZZATA
- RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE
