


PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO - ALTIPIANO



Città di Cuneo

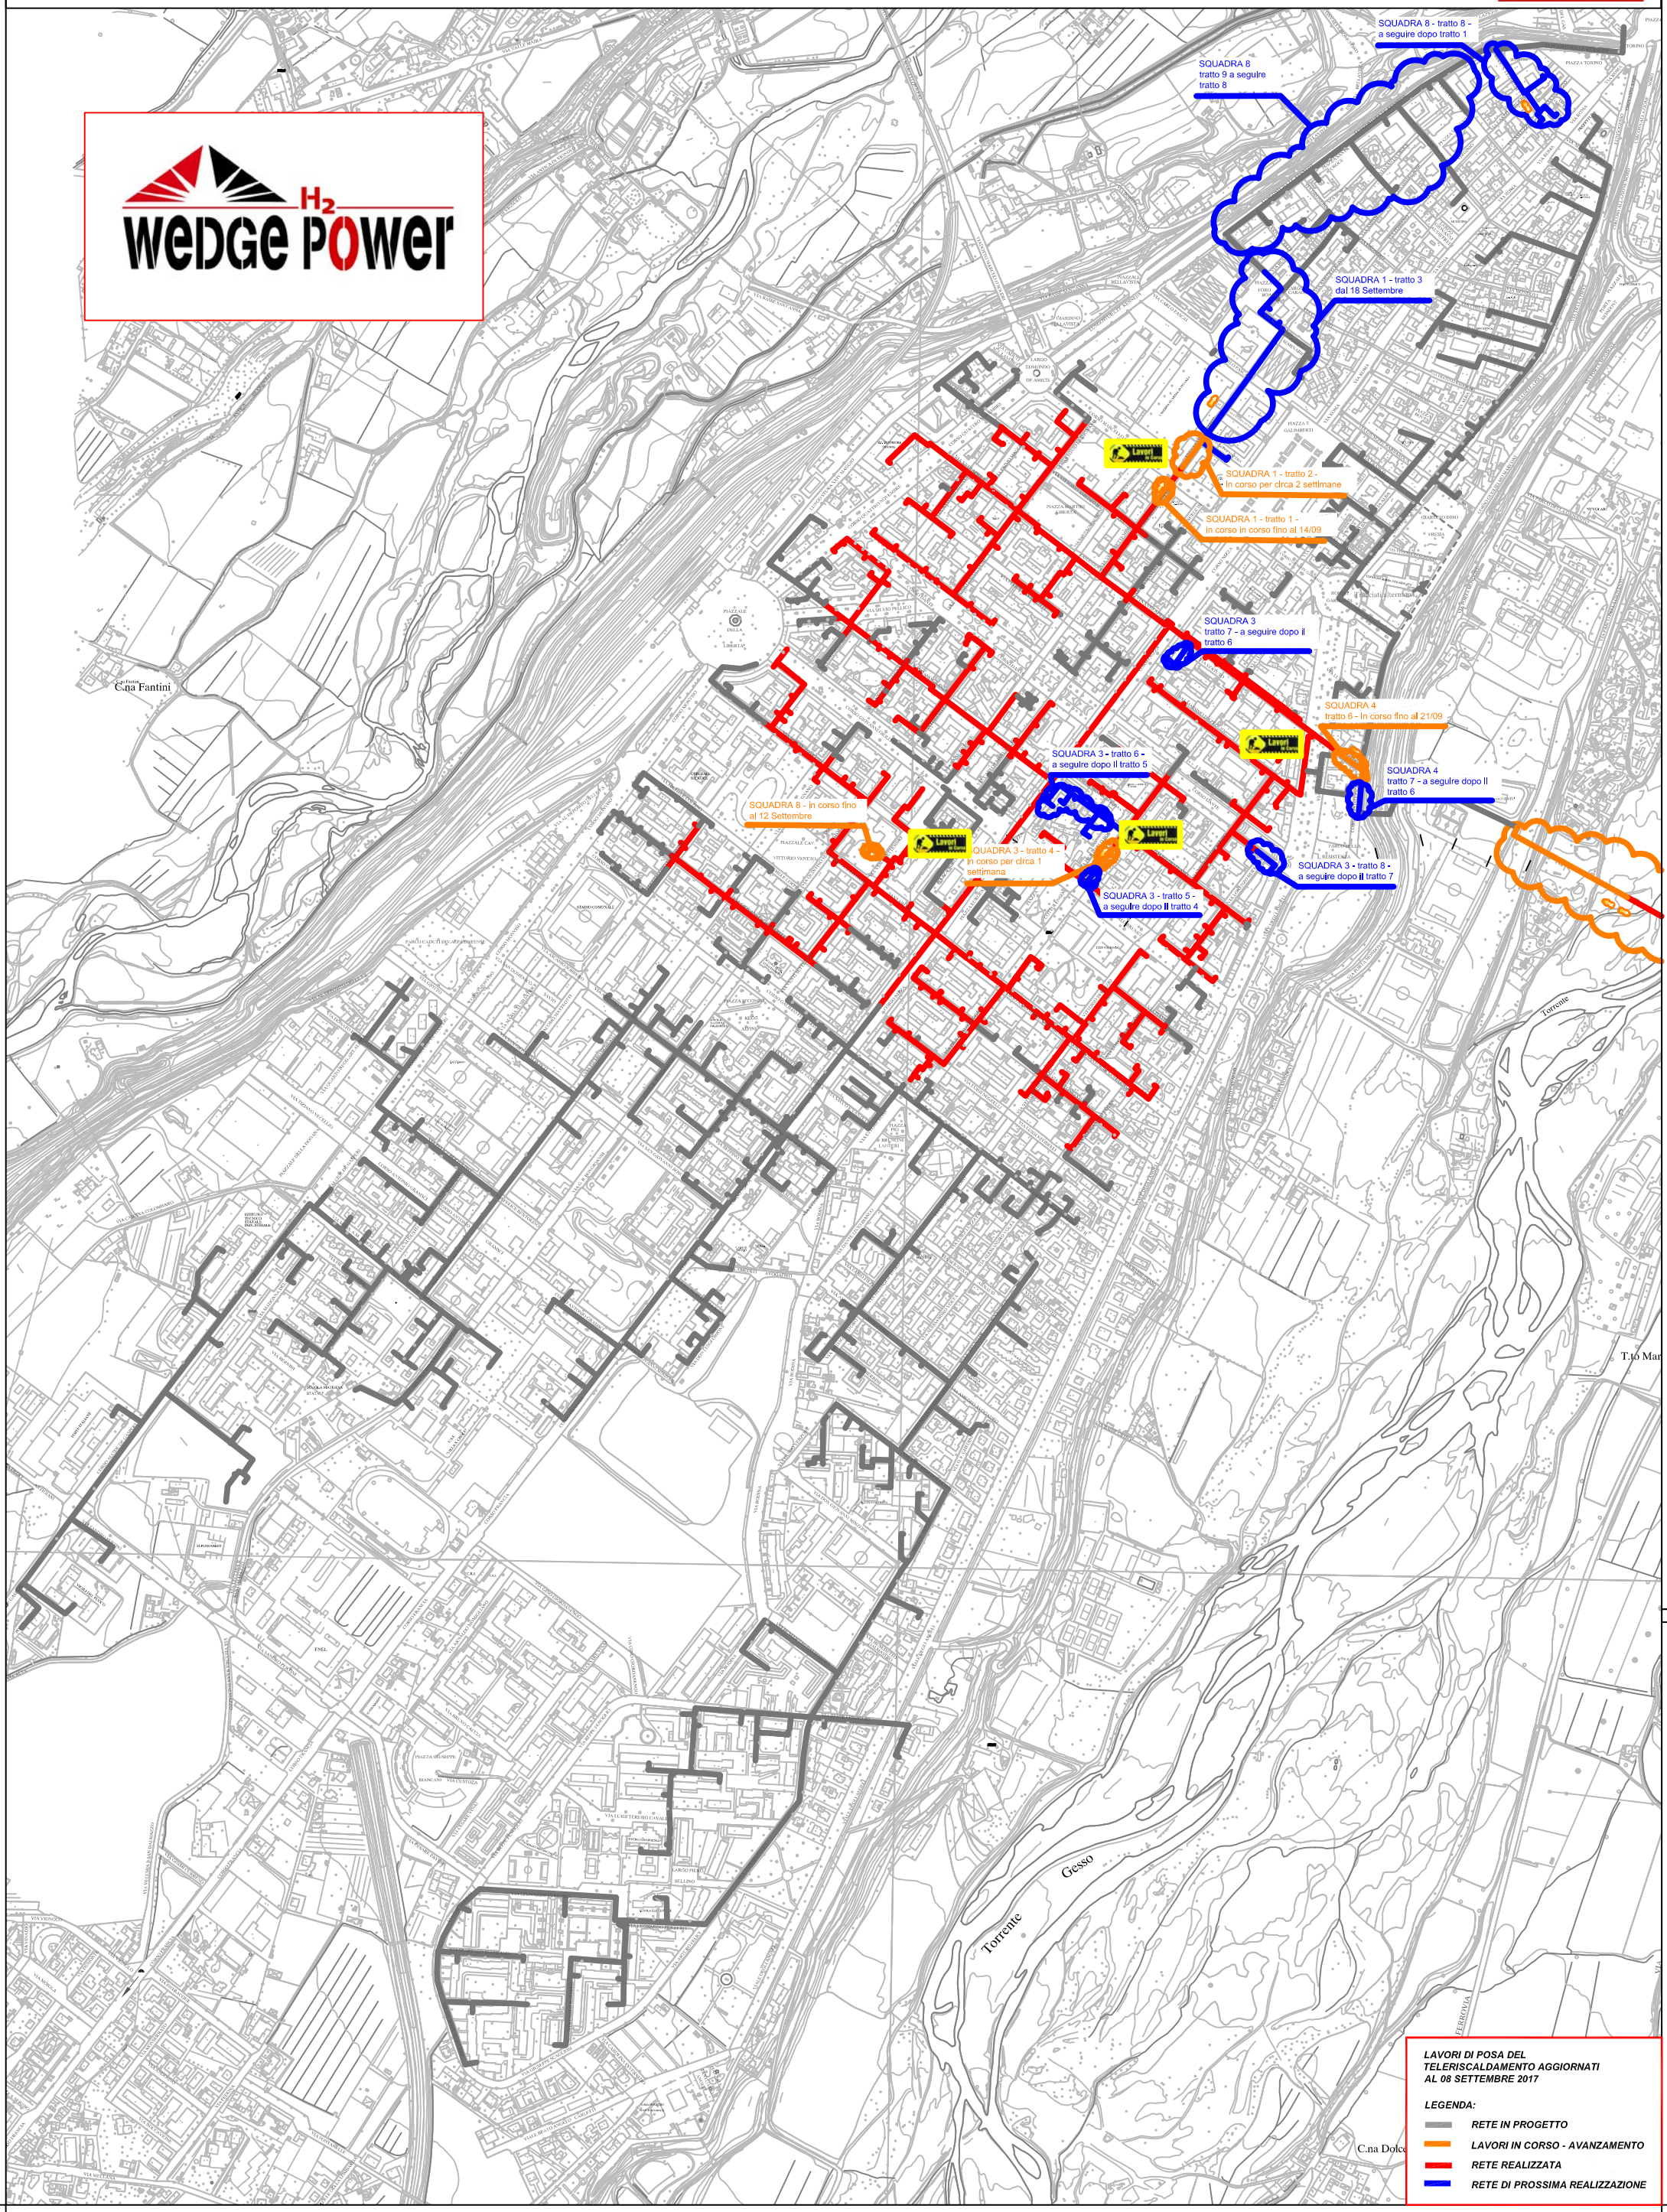

LAVORI DI POSA DEL TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI AL 08 SETTEMBRE 2017

LEGENDA:

- RETE IN PROGETTO
- LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
- RETE REALIZZATA
- RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE

SQUADRA 8 - in corso fino al 12 Settembre

SQUADRA 3 - tratto 4 - in corso per circa 1 settimana

SQUADRA 3 - tratto 5 - a seguire dopo il tratto 4

SQUADRA 3 - tratto 6 - a seguire dopo il tratto 5

SQUADRA 4 - tratto 6 - in corso fino al 21/09

SQUADRA 4 - tratto 7 - a seguire dopo il tratto 6

SQUADRA 3 - tratto 8 - a seguire dopo il tratto 7

SQUADRA 1 - tratto 2 - in corso per circa 2 settimane

SQUADRA 1 - tratto 1 - in corso in corso fino al 14/09

SQUADRA 3 - tratto 7 - a seguire dopo il tratto 6

SQUADRA 8 - tratto 9 a seguire tratto 8

SQUADRA 8 - tratto 8 - a seguire dopo tratto 1

SQUADRA 1 - tratto 3 dal 18 Settembre
