


PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO - ALTIPIANO

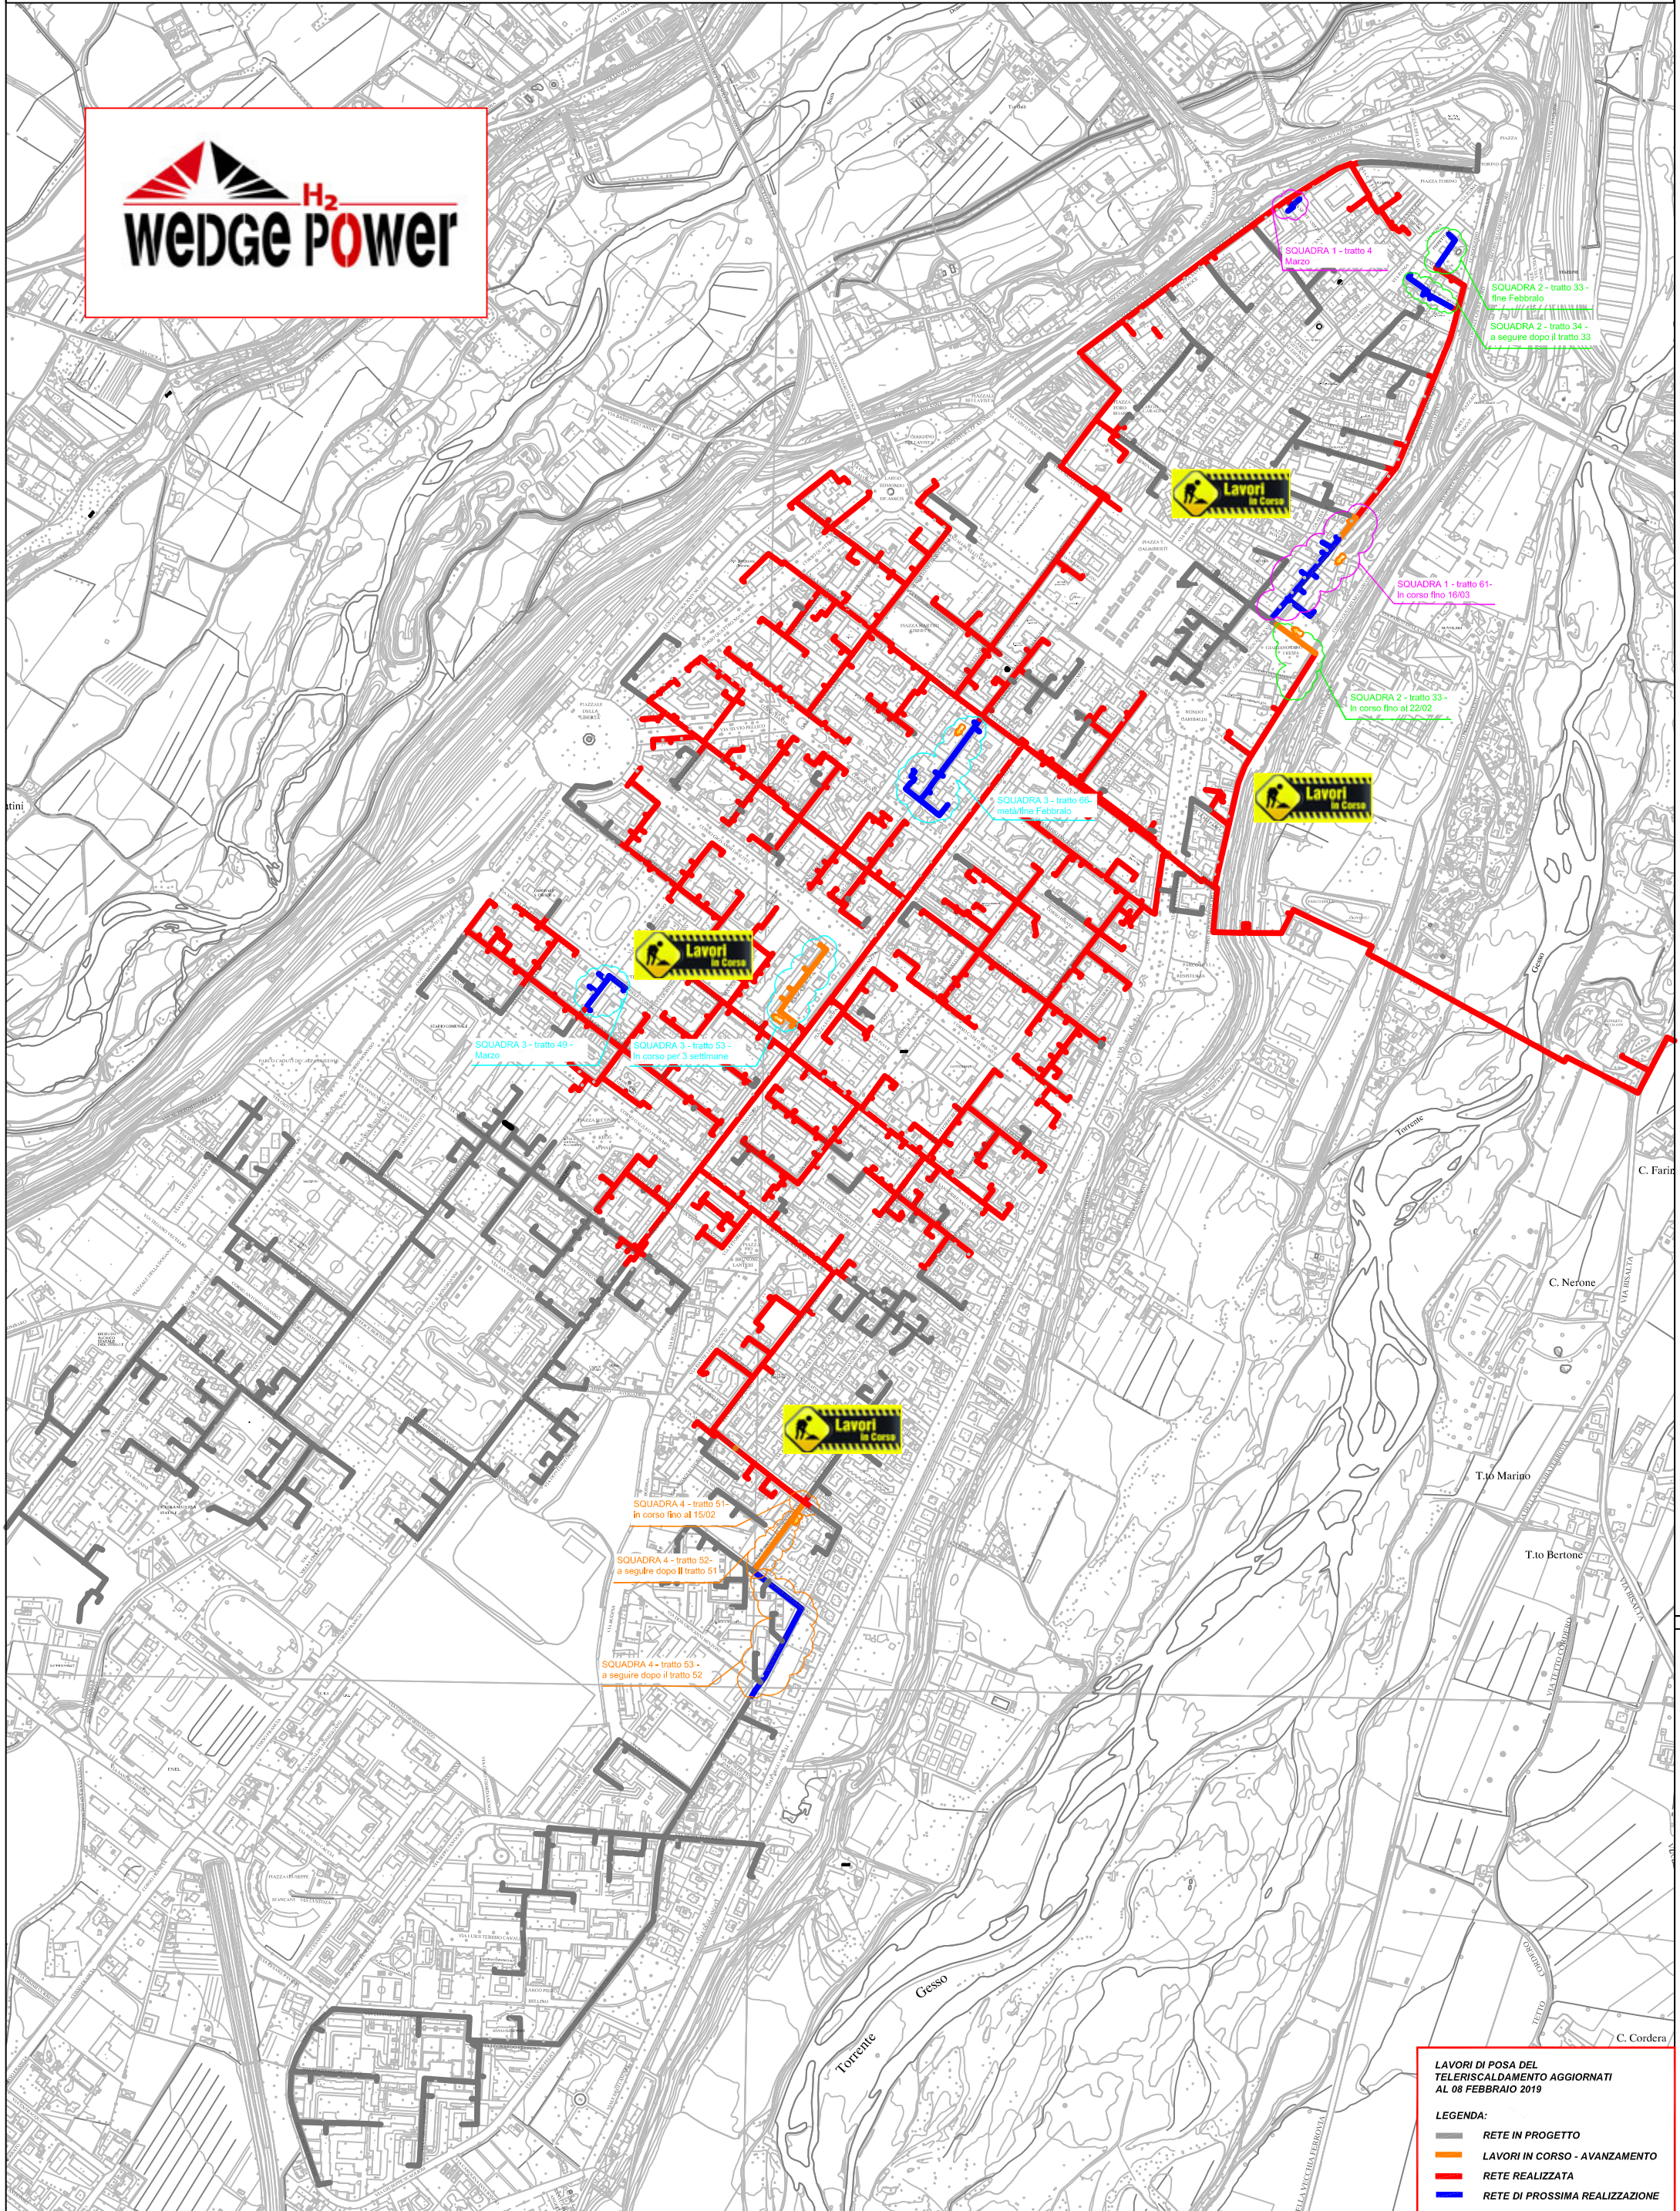

LAVORI DI POSA DEL TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI AL 08 FEBBRAIO 2019

LEGENDA:

- RETE IN PROGETTO
- LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
- RETE REALIZZATA
- RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE

SQUADRA 3 - tratto 49 - Marzo

SQUADRA 3 - tratto 53 - In corso per 3 settimane

SQUADRA 3 - tratto 56 - metà/ fine Febbraio

SQUADRA 2 - tratto 33 - In corso fino al 22/02

SQUADRA 1 - tratto 61 - In corso fino 16/03

SQUADRA 2 - tratto 33 - fine Febbraio

SQUADRA 2 - tratto 34 - a seguire dopo il tratto 33

SQUADRA 4 - tratto 51 - in corso fino al 15/02

SQUADRA 4 - tratto 52 - a seguire dopo il tratto 51

SQUADRA 4 - tratto 53 - a seguire dopo il tratto 52
