


PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO - ALTIPIANO

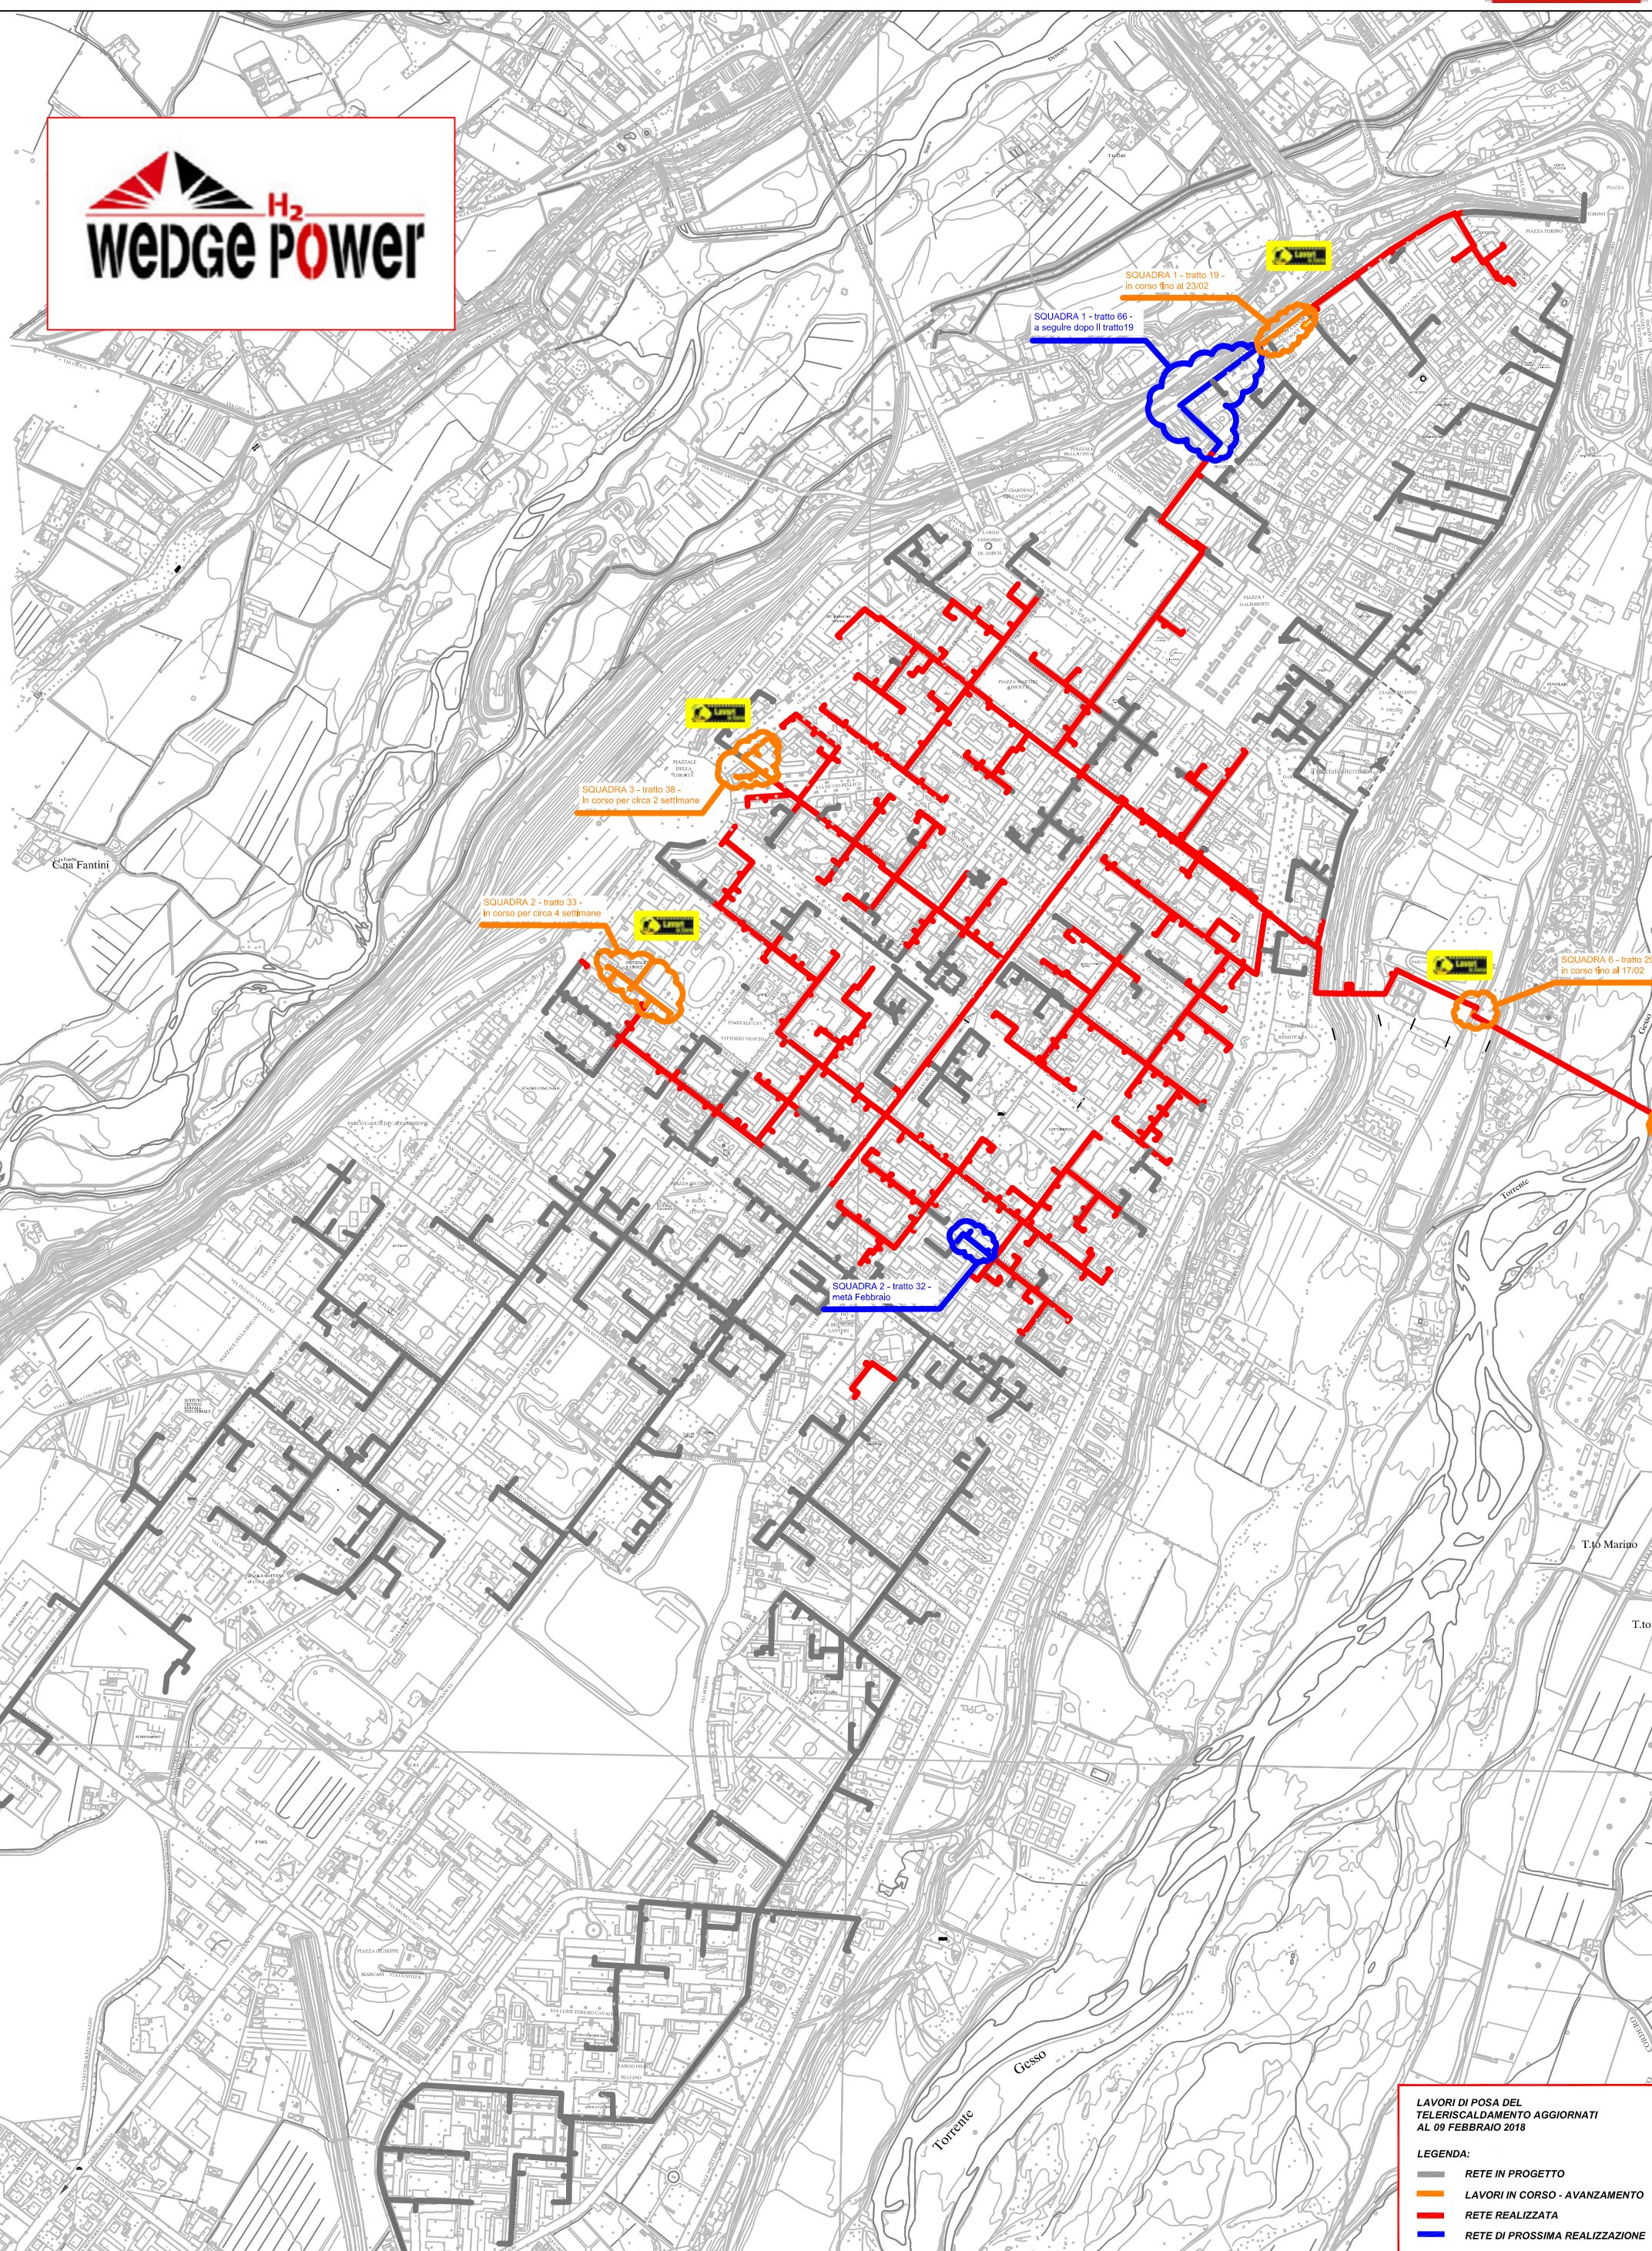

SQUADRA 1 - tratto 19 -
in corso fino al 23/02

SQUADRA 1 - tratto 06 -
a seguire dopo il tratto 19

SQUADRA 3 - tratto 38 -
In corso per circa 2 settimane

SQUADRA 2 - tratto 33 -
In corso per circa 4 settimane

SQUADRA 2 - tratto 32 -
meta' Febbraio

SQUADRA 6 - tratto 23 -
in corso fino al 17/02

LAVORI DI POSA DEL
TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI
AL 09 FEBBRAIO 2018

LEGENDA:

- RETE IN PROGETTO
- LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
- RETE REALIZZATA
- RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE
