


# PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO - ALTIPIANO

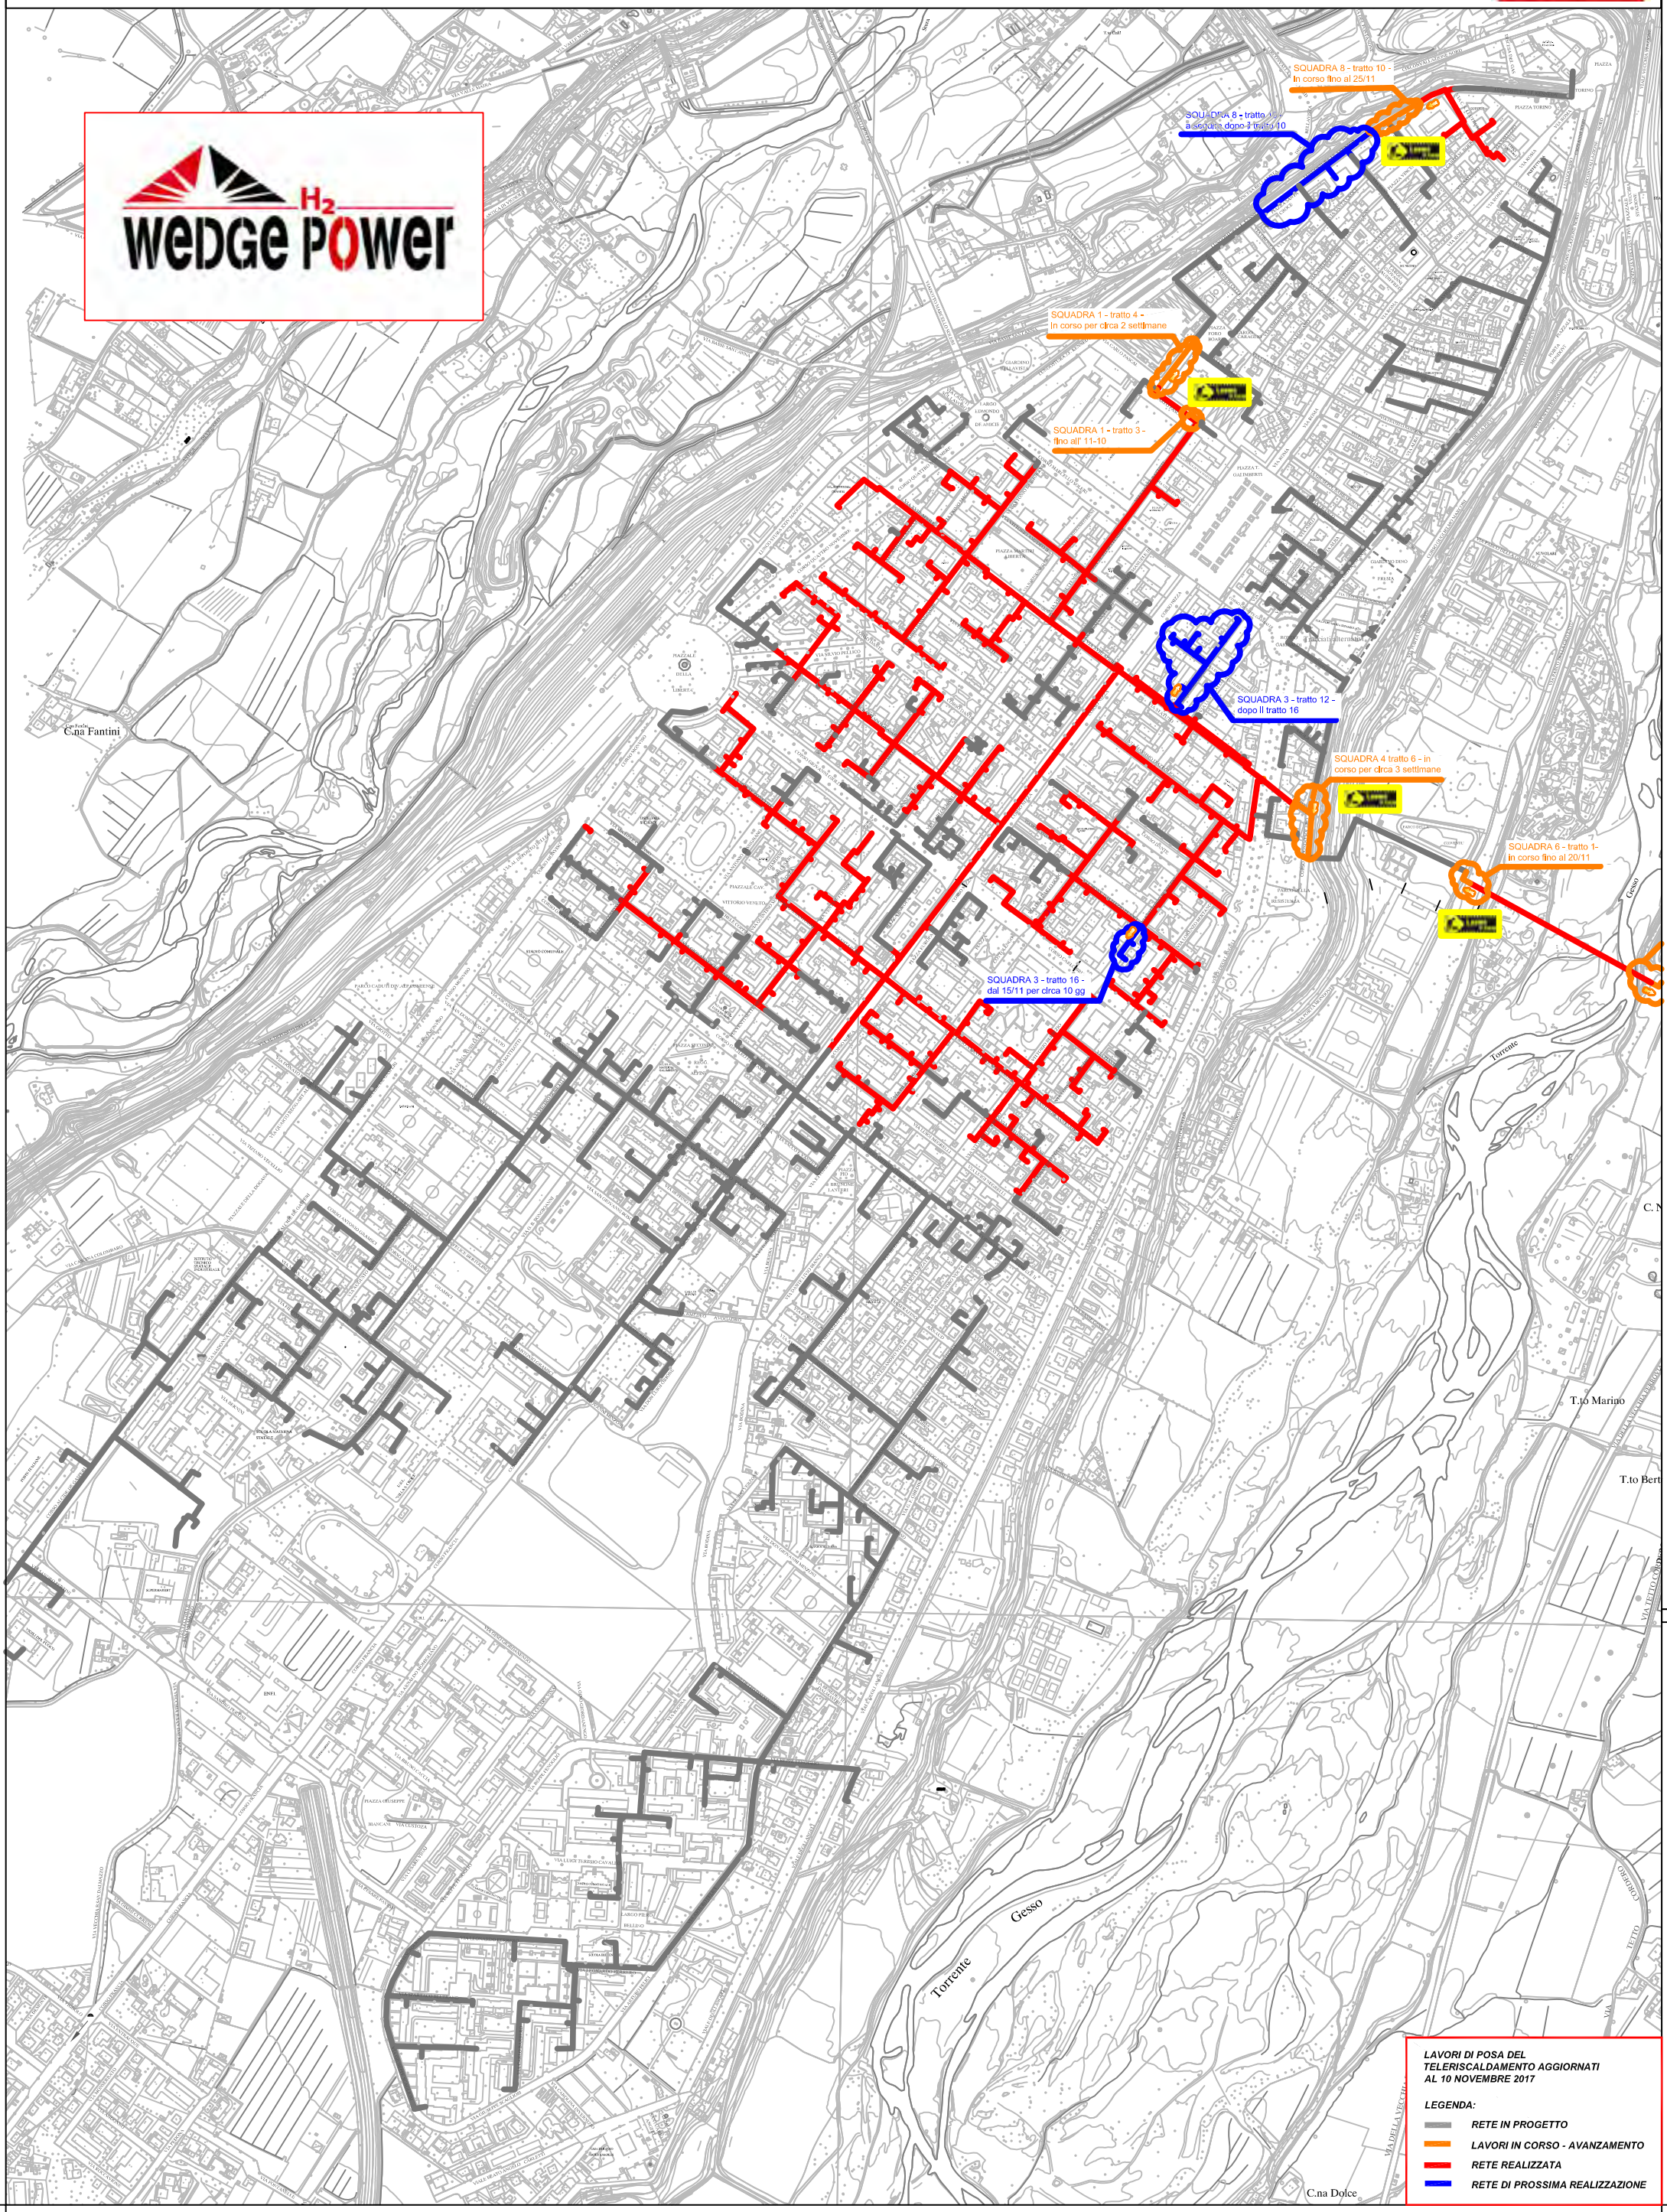

SQUADRA 8 - tratto 10 - In corso fino al 25/11

SQUADRA 8 - tratto 9 - a seguire dopo il tratto 10

SQUADRA 1 - tratto 4 - In corso per circa 2 settimane

SQUADRA 1 - tratto 3 - fino all' 11-10

SQUADRA 3 - tratto 12 - dopo il tratto 16

SQUADRA 4 tratto 6 - in corso per circa 3 settimane

SQUADRA 6 - tratto 1 - in corso fino al 20/11

SQUADRA 3 - tratto 16 - dal 15/11 per circa 10 gg

**LAVORI DI POSA DEL TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI AL 10 NOVEMBRE 2017**

**LEGENDA:**

- RETE IN PROGETTO
- LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
- RETE REALIZZATA
- RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE
