


# PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO - ALTIPIANO

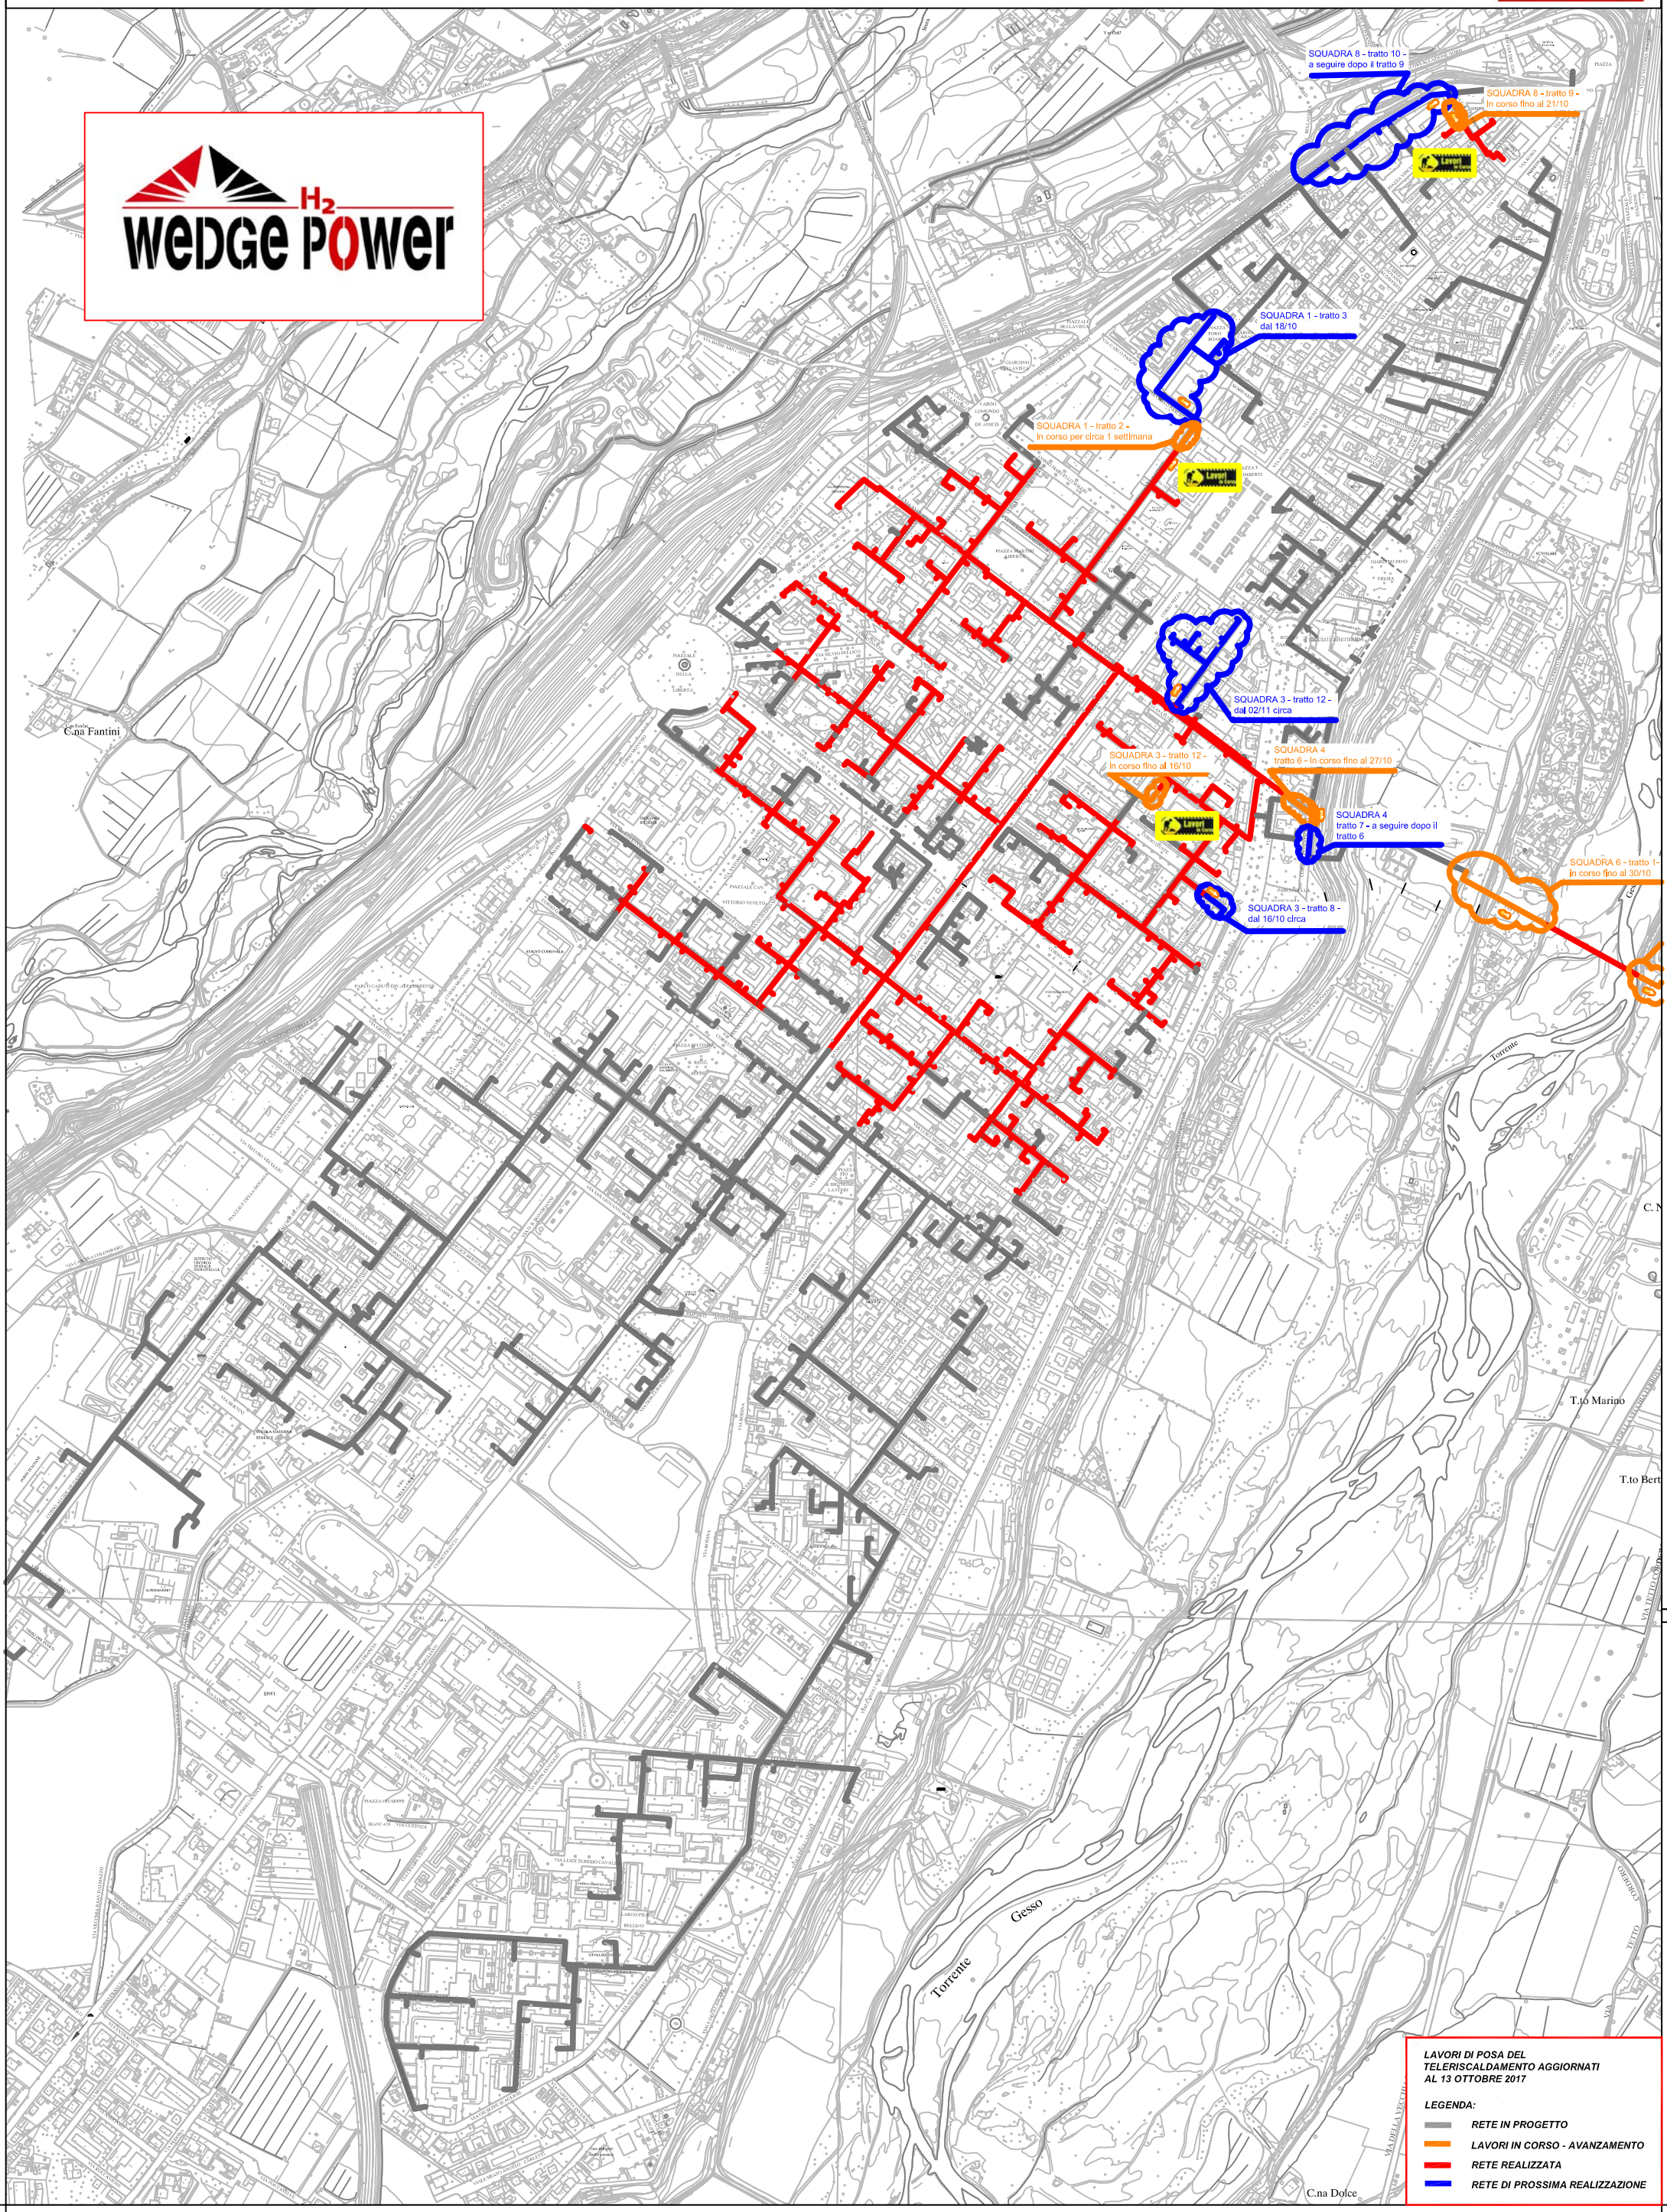

SQUADRA 8 - tratto 10 - a seguire dopo il tratto 9

SQUADRA 6 - tratto 9 - in corso fino al 21/10

SQUADRA 1 - tratto 3 - dal 18/10

SQUADRA 1 - tratto 2 - in corso per circa 1 settimana

SQUADRA 3 - tratto 12 - dal 02/11 circa

SQUADRA 3 - tratto 12 - in corso fino al 16/10

SQUADRA 4 - tratto 6 - in corso fino al 27/10

SQUADRA 4 - tratto 7 - a seguire dopo il tratto 6

SQUADRA 3 - tratto 8 - dal 16/10 circa

SQUADRA 6 - tratto 1 - in corso fino al 30/10

LAVORI DI POSA DEL TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI AL 13 OTTOBRE 2017

LEGENDA:

- RETE IN PROGETTO
- LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
- RETE REALIZZATA
- RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE
