


PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO - ALTIPIANO

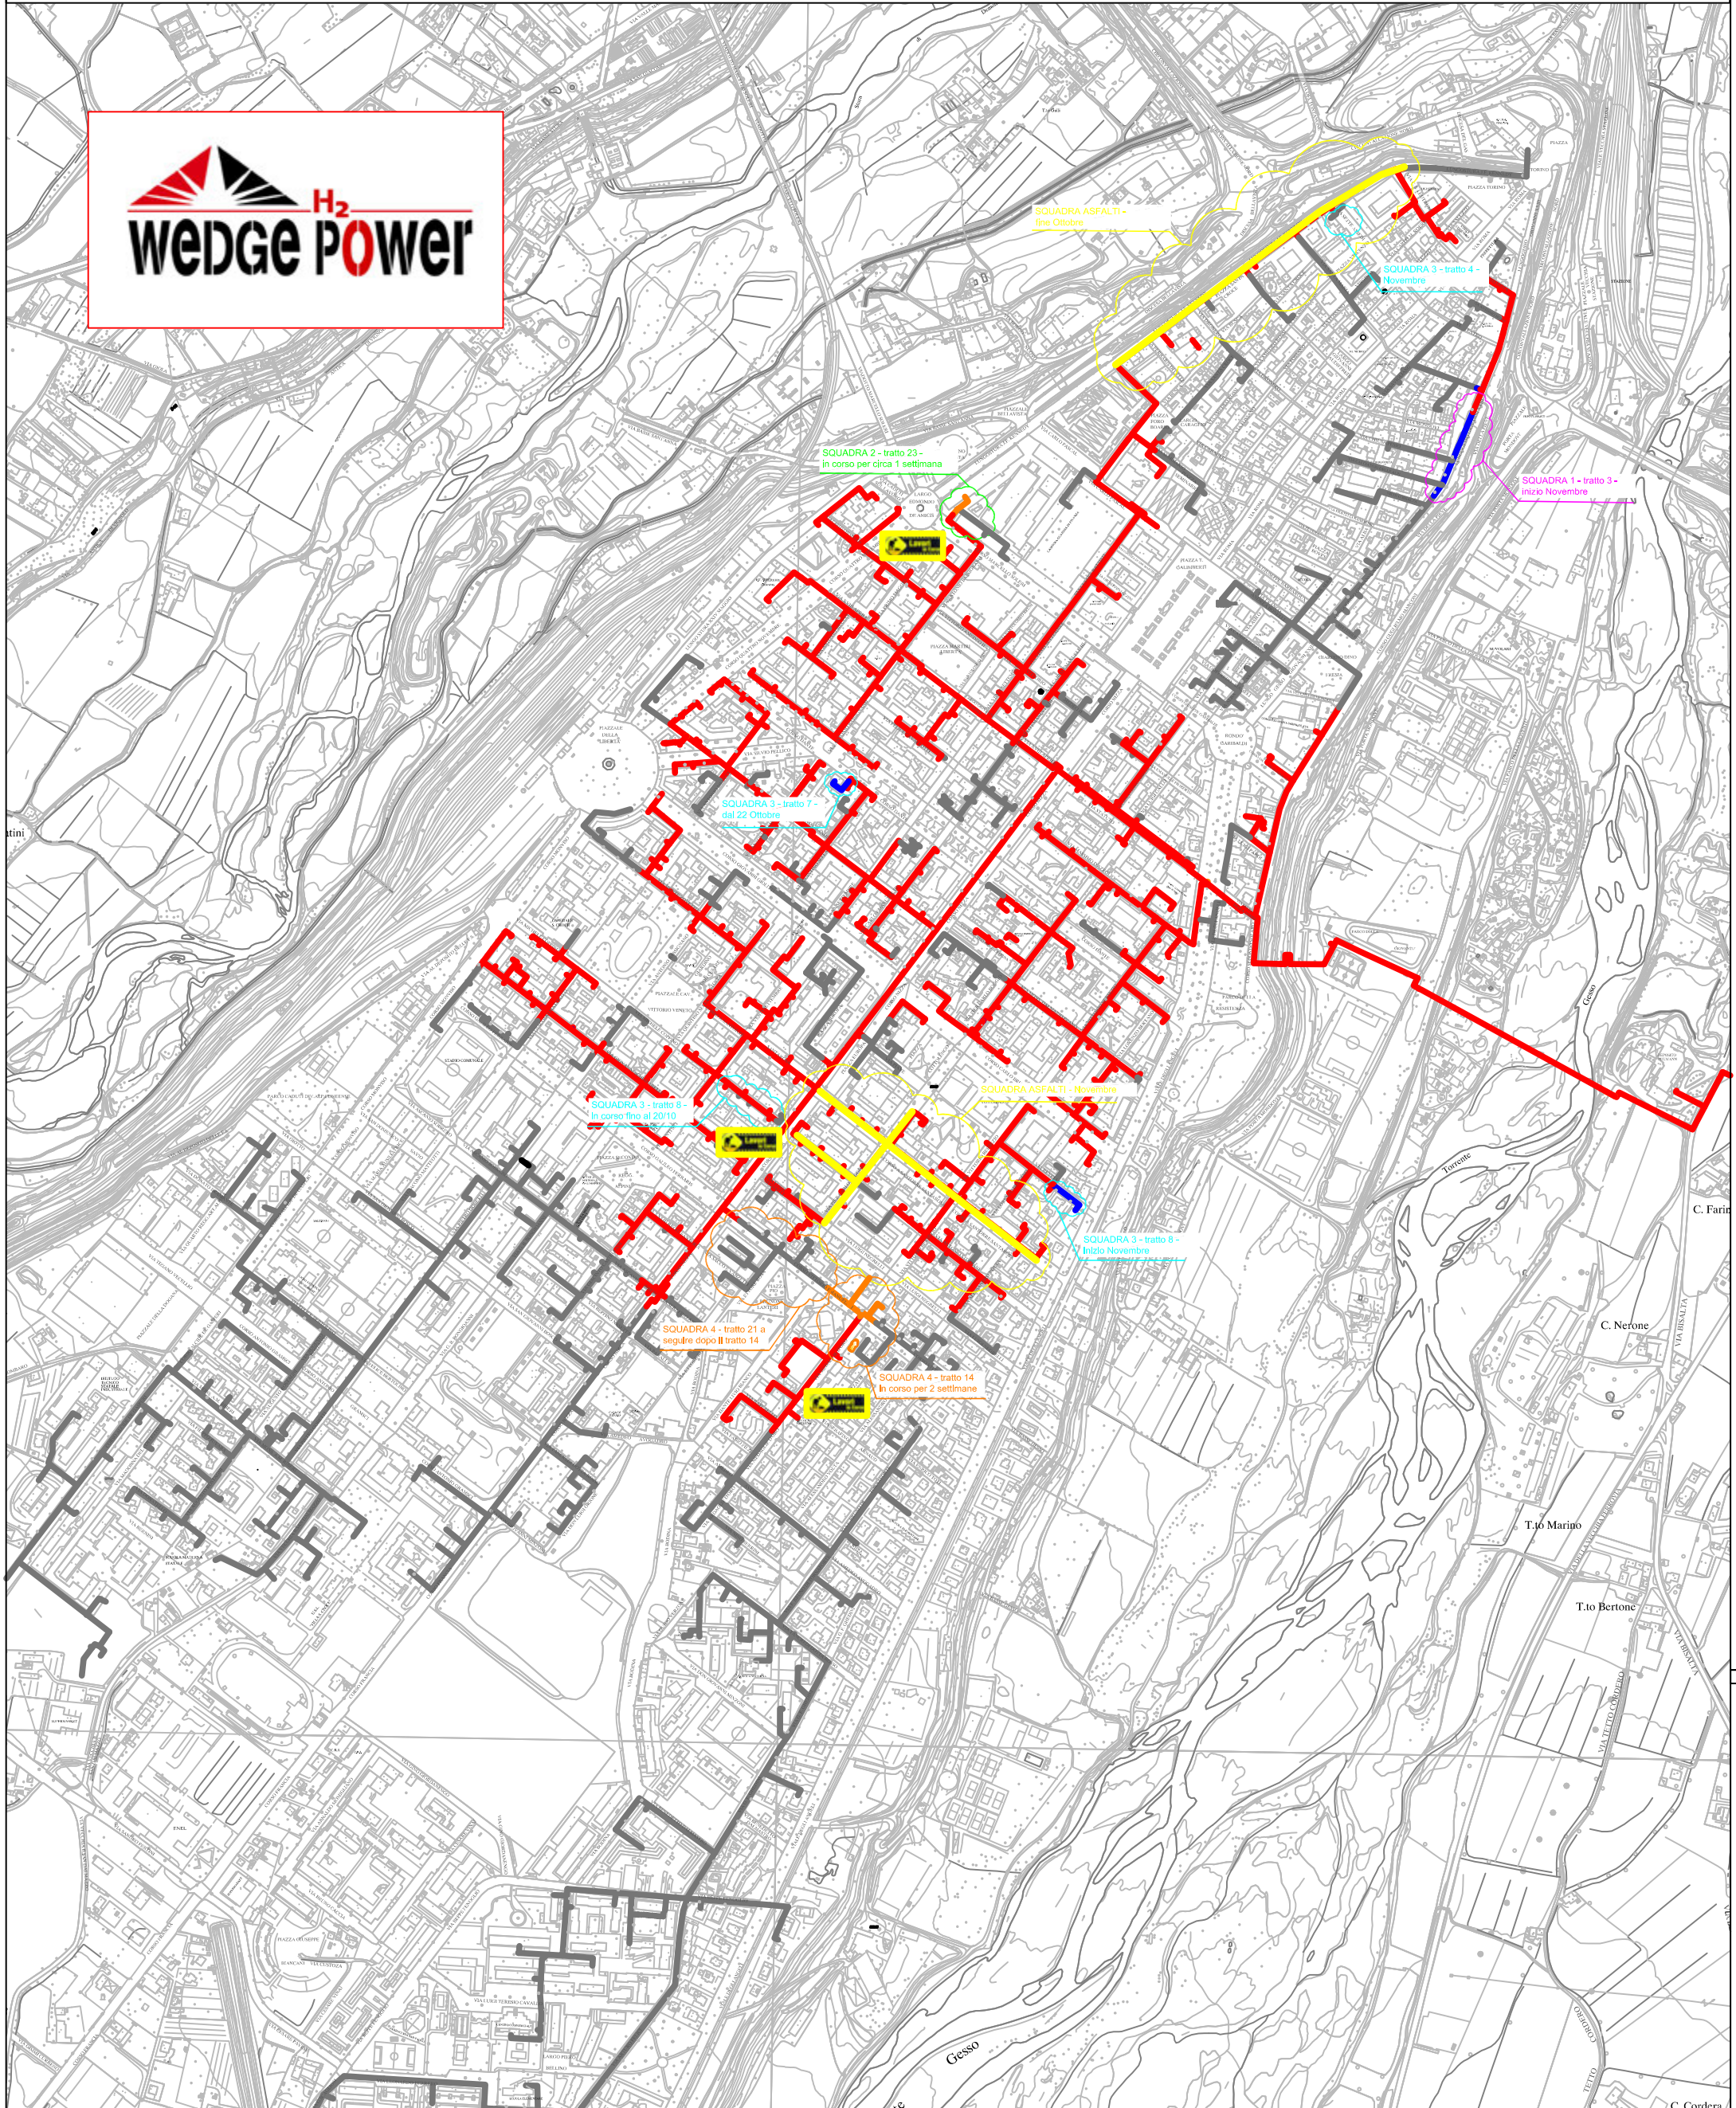

SQUADRA ASFALTI - fine Ottobre

SQUADRA 3 - tratto 4 - Novembre

SQUADRA 2 - tratto 23 - in corso per circa 1 settimana

SQUADRA 1 - tratto 3 - inizio Novembre

SQUADRA 3 - tratto 7 - dal 22 Ottobre

SQUADRA 3 - tratto 8 - In corso fino al 20/10

SQUADRA ASFALTI - Novembre

SQUADRA 3 - tratto 8 - inizio Novembre

SQUADRA 4 - tratto 21 a seguire dopo il tratto 14

SQUADRA 4 - tratto 14 In corso per 2 settimane

LAVORI DI POSA DEL Teleriscaldamento AGGIORNATI AL 19 OTTOBRE 2018

LEGGENDA:

- RETE IN PROGETTO
- LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
- RETE REALIZZATA
- RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE
