



# PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO - ALTIPIANO

SQUADRA 1

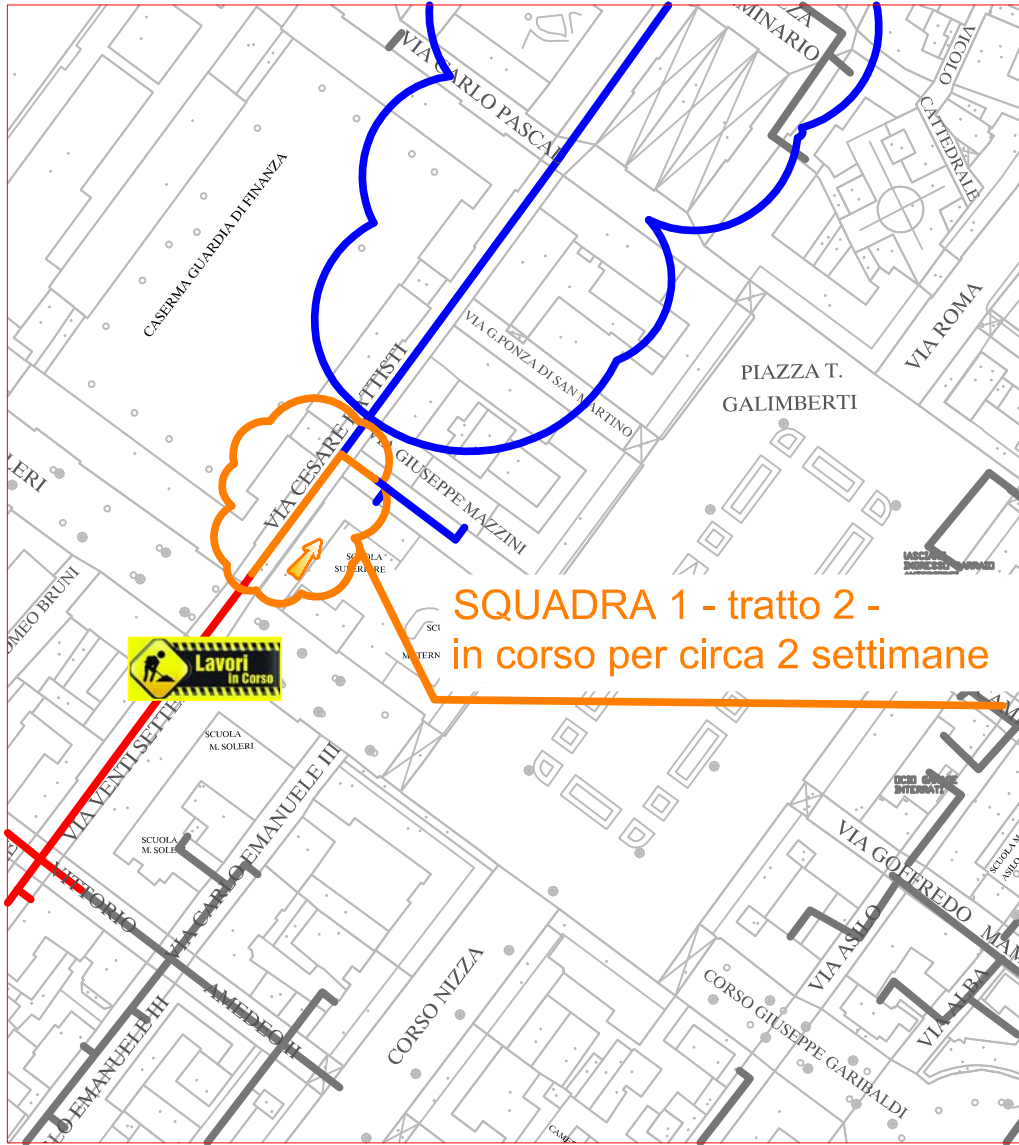


SQUADRA 1 - tratto 2 -  
in corso per circa 2 settimane

SQUADRA 8

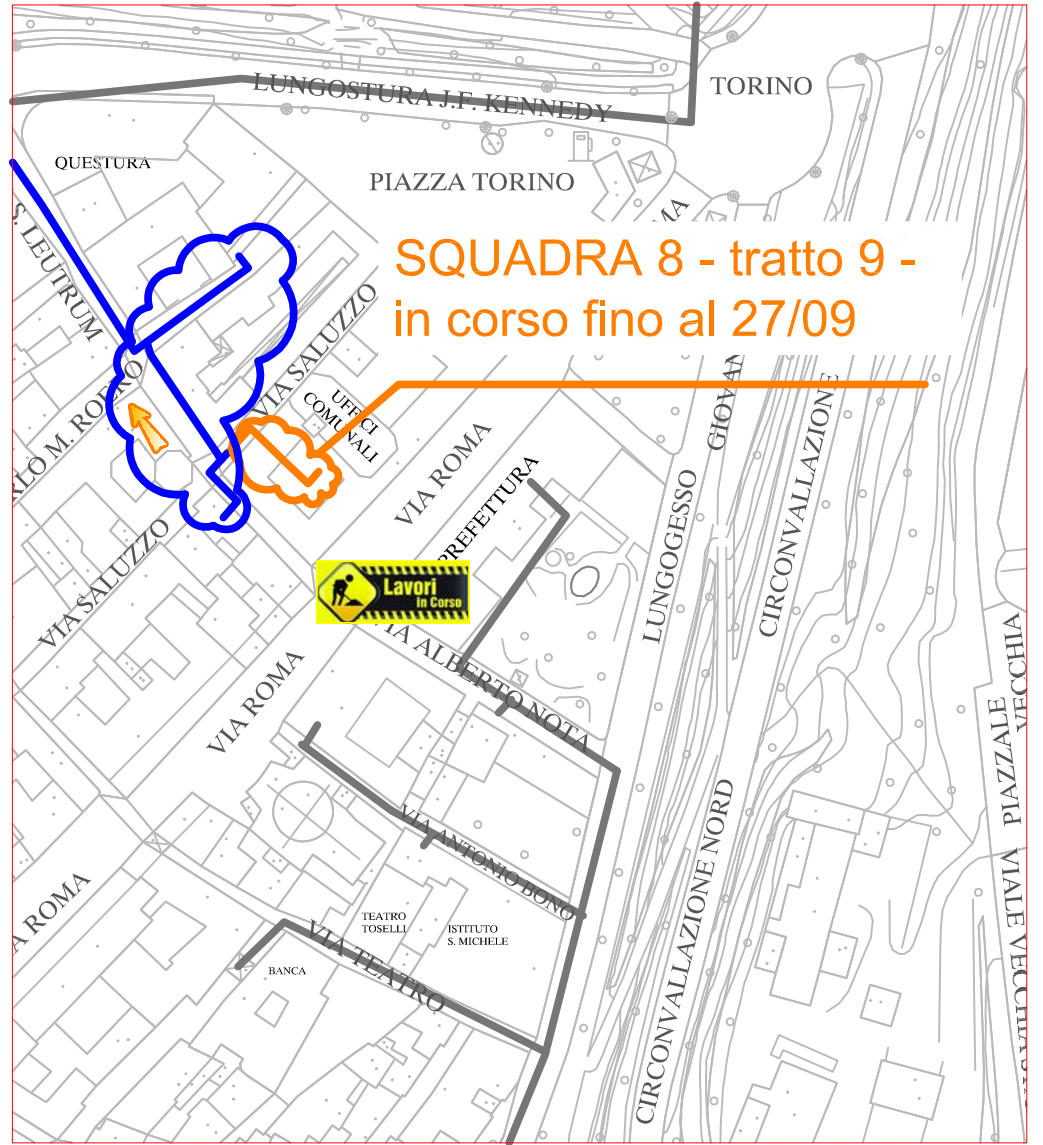

SQUADRA 8 - tratto 9 -  
in corso fino al 27/09


SQUADRA 3

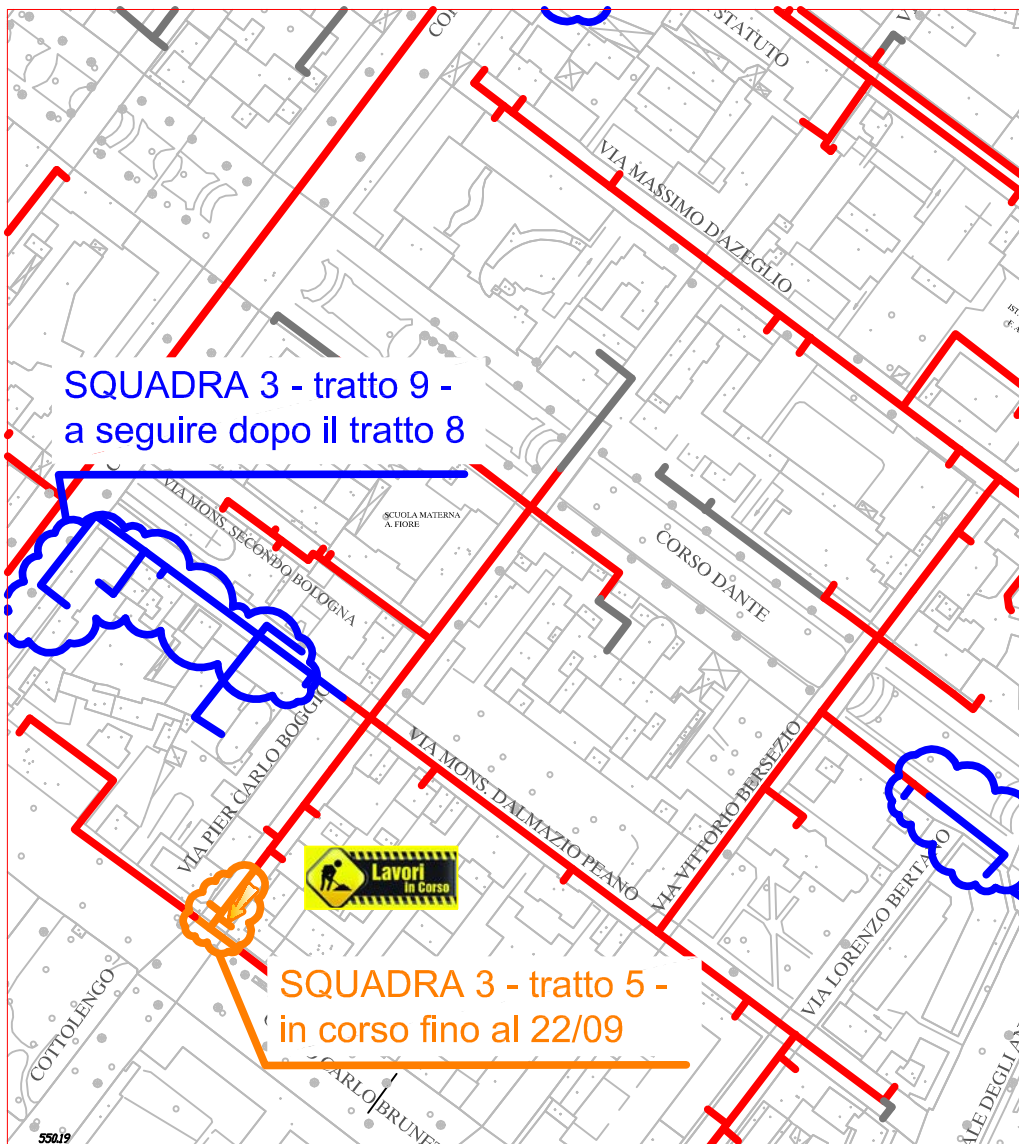

SQUADRA 3 - tratto 9 -  
a seguire dopo il tratto 8

SQUADRA 3 - tratto 5 -  
in corso fino al 22/09

SQUADRA 4

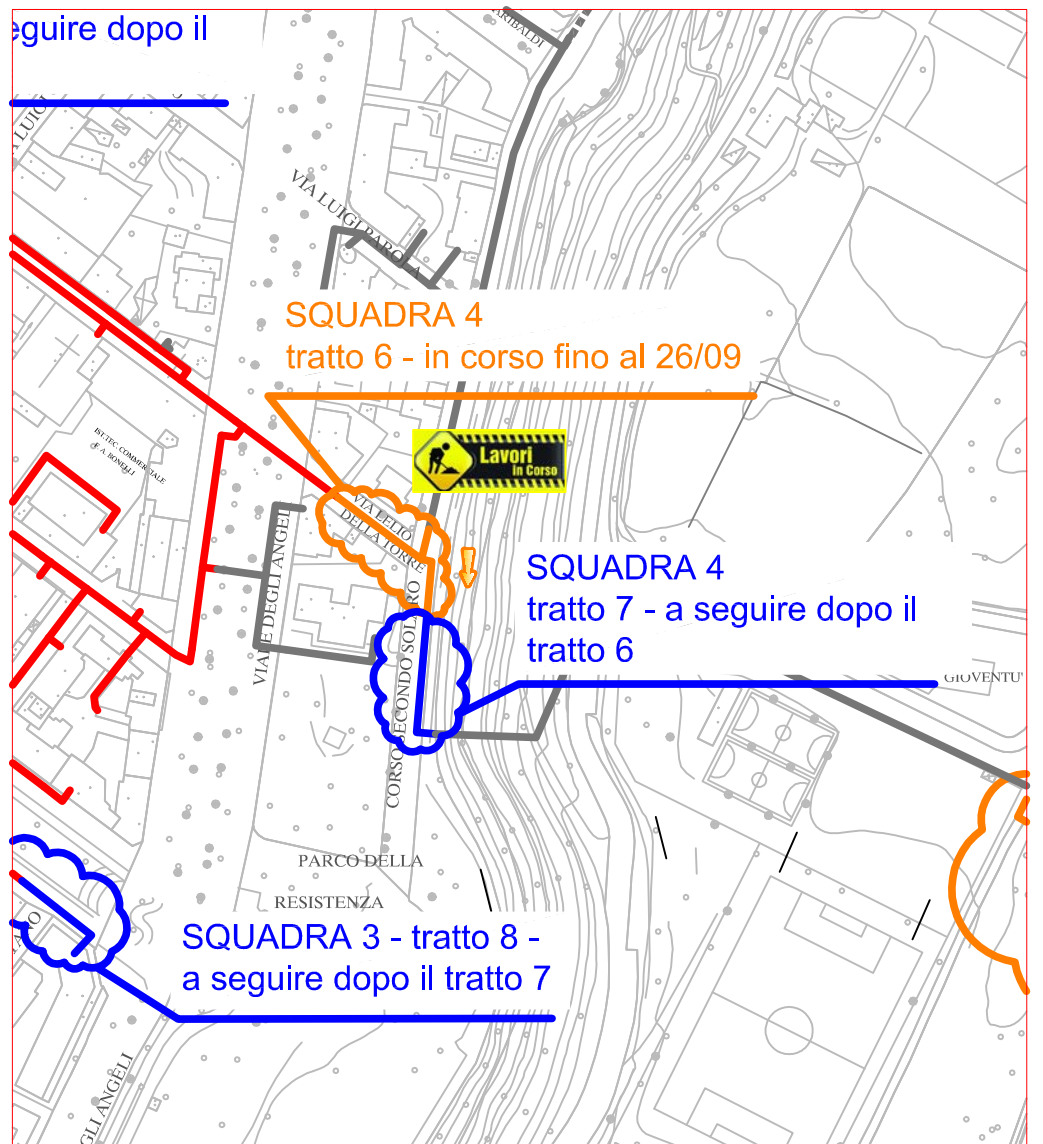

SQUADRA 4  
tratto 6 - in corso fino al 26/09

SQUADRA 4  
tratto 7 - a seguire dopo il  
tratto 6

SQUADRA 3 - tratto 8 -  
a seguire dopo il tratto 7



LAVORI DI POSA DEL  
TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI  
AL 15 SETTEMBRE 2017

LEGENDA:

- RETE IN PROGETTO
- LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
- RETE REALIZZATA
- RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE
