


PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO - DORSALE

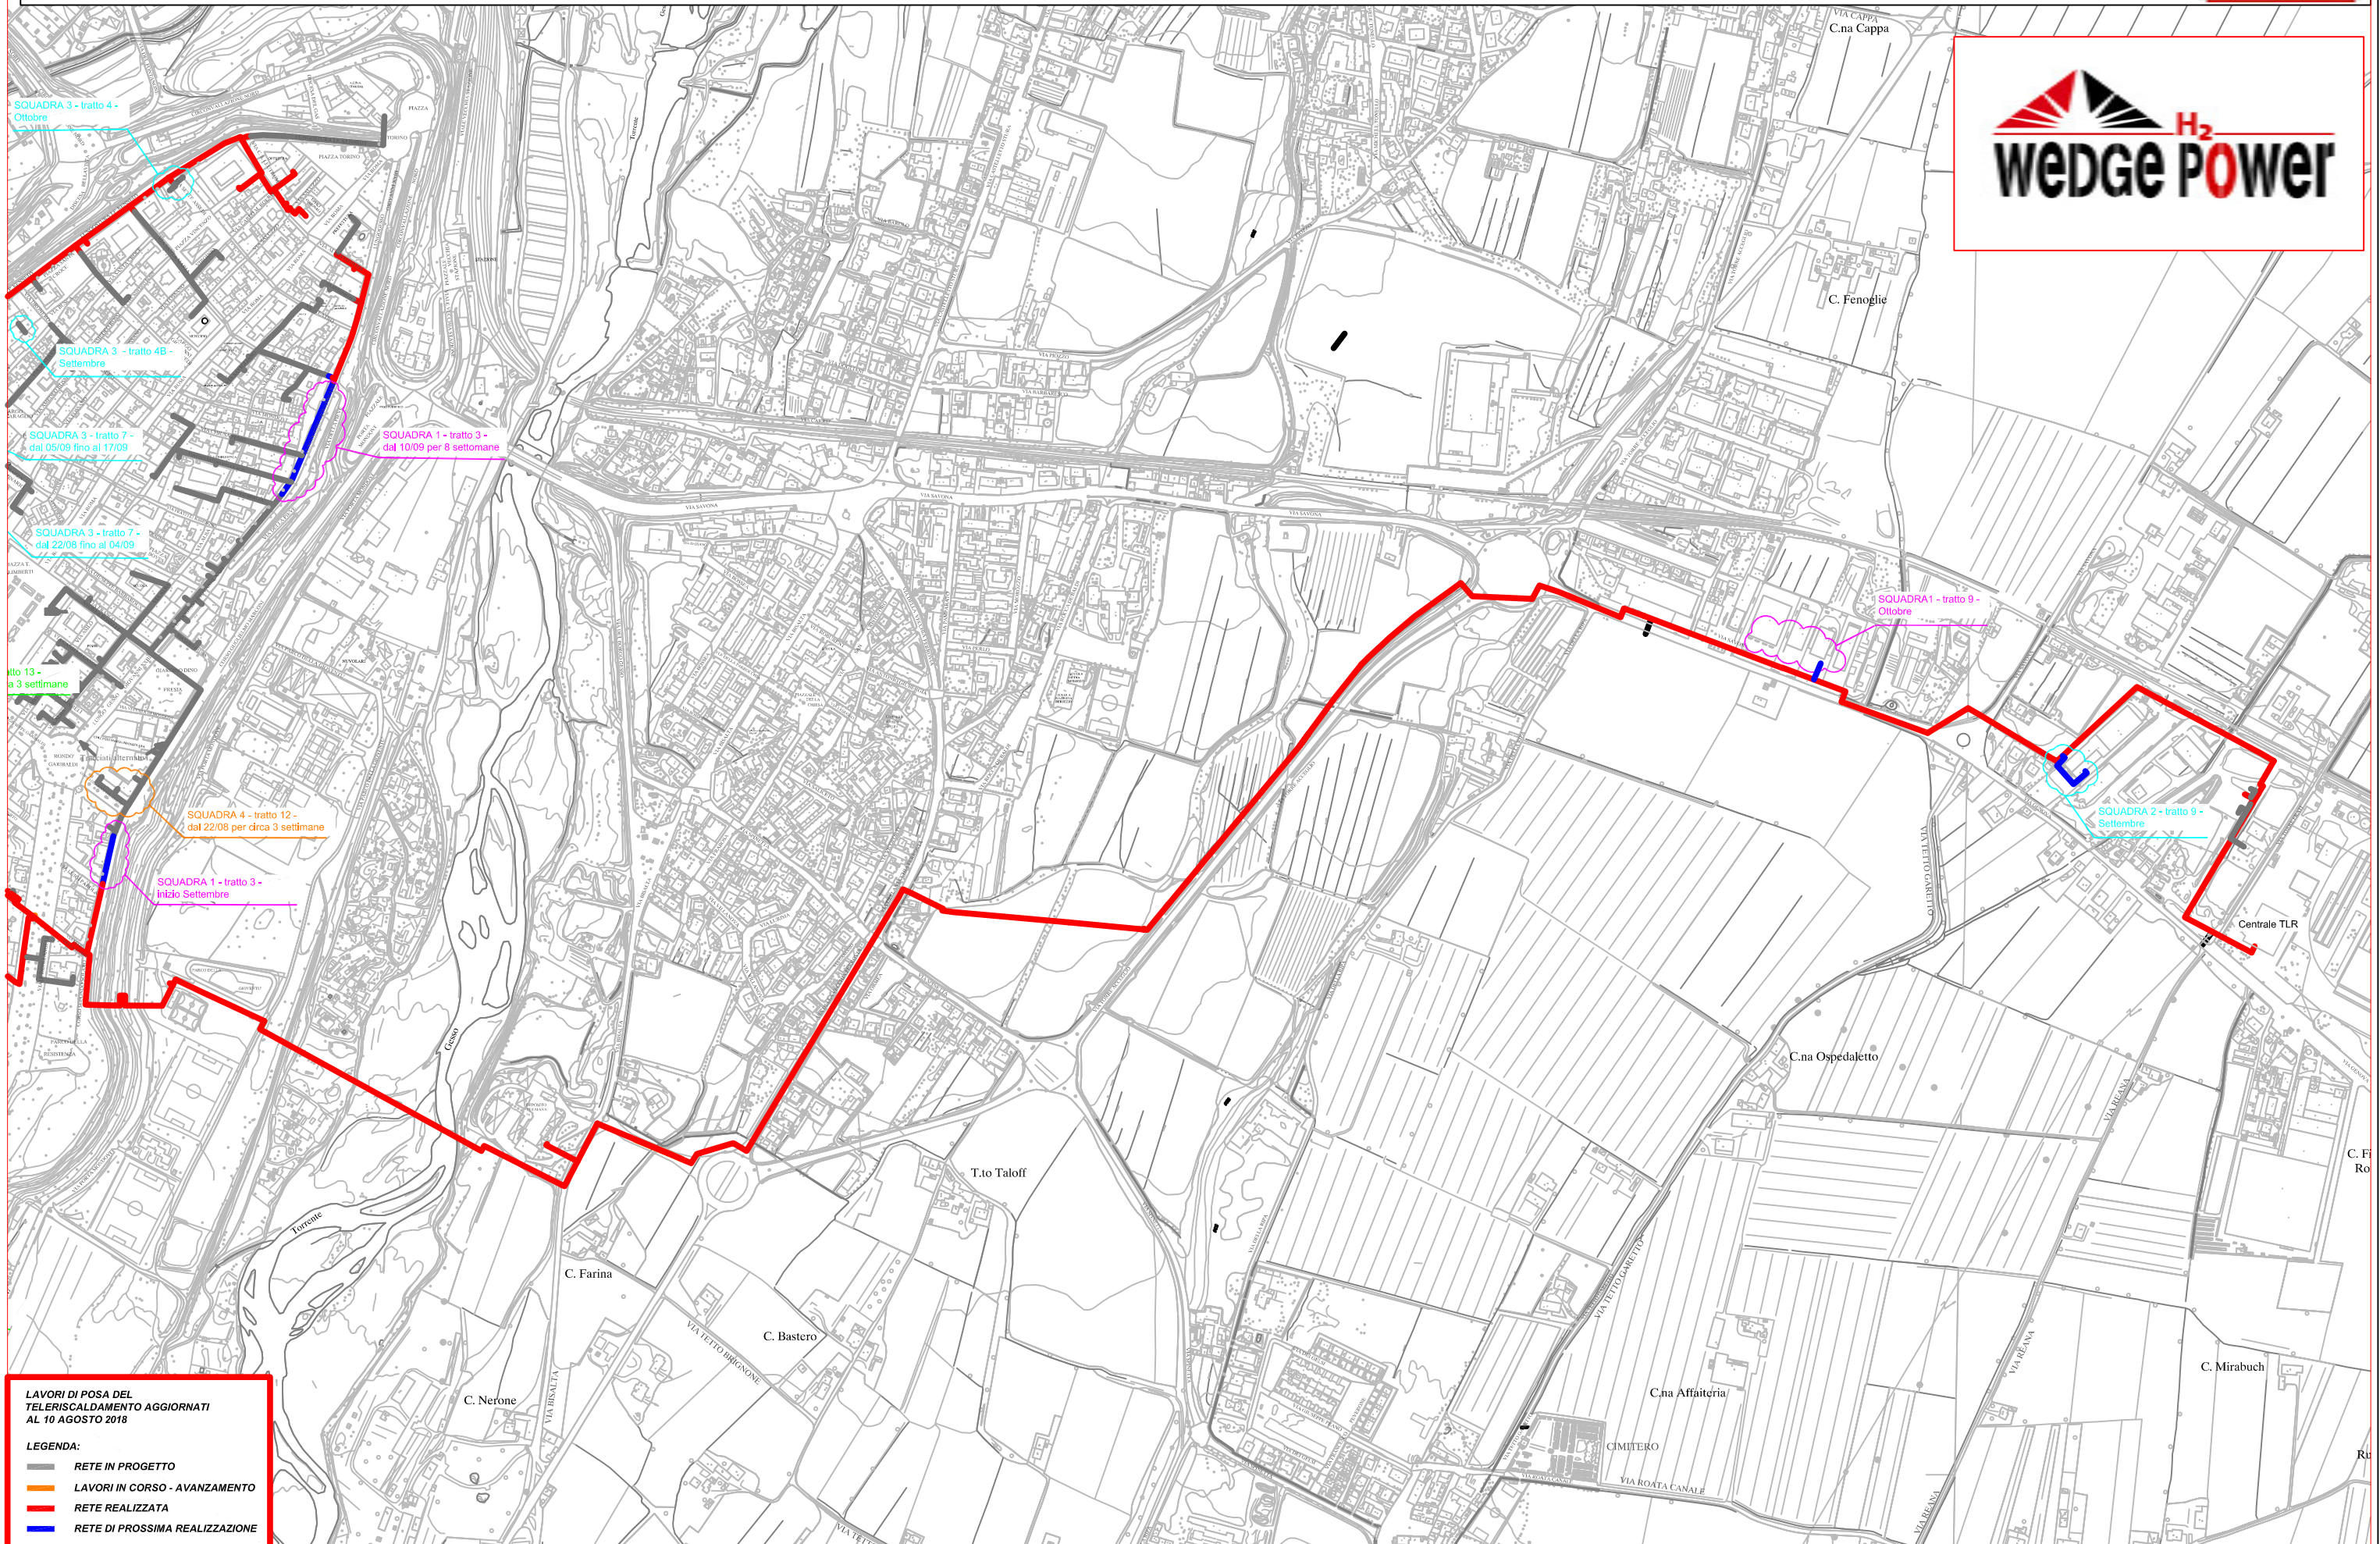

SQUADRA 3 - tratto 4 - Ottobre

SQUADRA 3 - tratto 4B - Settembre

SQUADRA 3 - tratto 7 - dal 05/09 fino al 17/09

SQUADRA 3 - tratto 7 - dal 22/08 fino al 04/09

SQUADRA 1 - tratto 3 - dal 10/09 per 8 settimane

Tratto 13 - a 3 settimane

SQUADRA 4 - tratto 12 - dal 22/08 per circa 3 settimane

SQUADRA 1 - tratto 3 - inizio Settembre

SQUADRA 1 - tratto 9 - Ottobre

SQUADRA 2 - tratto 9 - Settembre

LAVORI DI POSA DEL Teleriscaldamento AGGIORNATI AL 10 AGOSTO 2018

LEGENDA:

- RETE IN PROGETTO
- LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
- RETE REALIZZATA
- RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE
