


PLANIMETRIA RETE TLR - CITTA' DI CUNEO - DORSALE

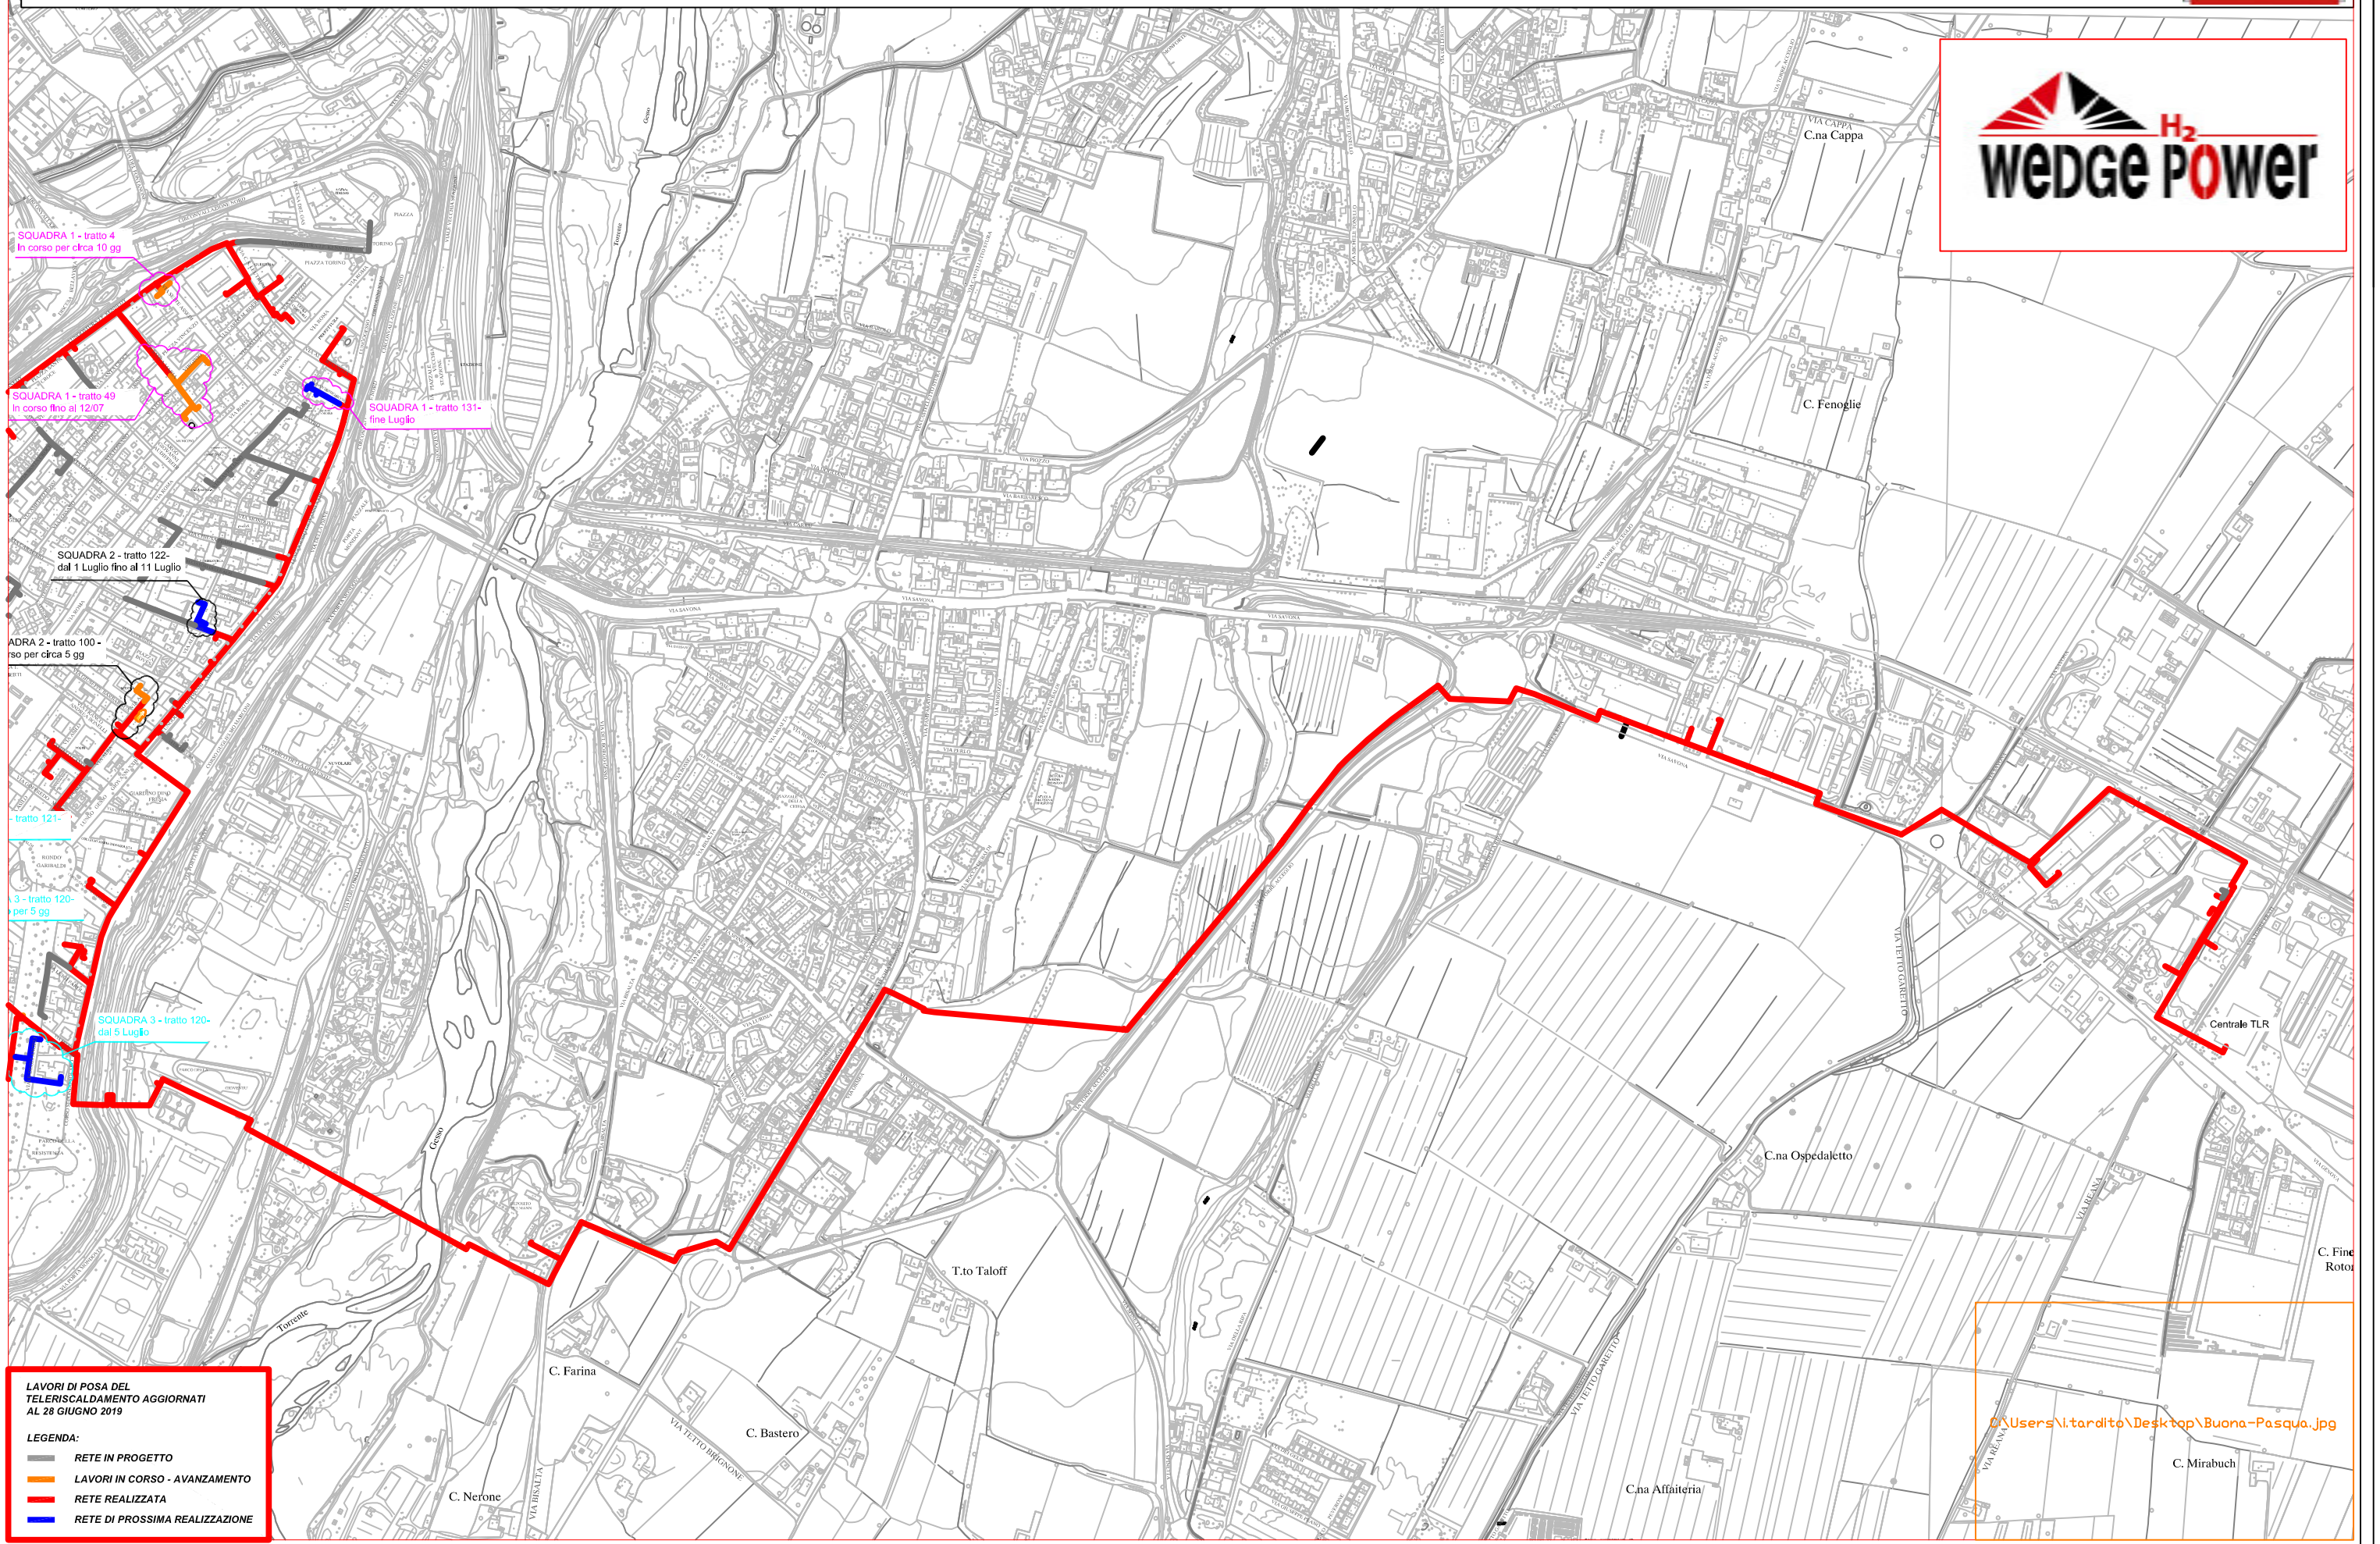

SQUADRA 1 - tratto 4
In corso per circa 10 gg

SQUADRA 1 - tratto 49
In corso fino al 12/07

SQUADRA 1 - tratto 131-
fine Luglio

SQUADRA 2 - tratto 122-
dal 1 Luglio fino al 11 Luglio

SQUADRA 2 - tratto 100-
in corso per circa 5 gg

SQUADRA 3 - tratto 120-
per 5 gg

SQUADRA 3 - tratto 120-
dal 5 Luglio

LAVORI DI POSA DEL
TELERISCALDAMENTO AGGIORNATI
AL 28 GIUGNO 2019

LEGENDA:

- RETE IN PROGETTO
- LAVORI IN CORSO - AVANZAMENTO
- RETE REALIZZATA
- RETE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE

C:\Users\l.tardito\Desktop\Buona-Pasqua.jpg
